

DOCUMENTO DE RECURSOS DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Recursos

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 17/09

Estimativa, Aquisição e Histograma de Recursos

Os processos de Estimar, Adquirir e Monitorar e Controlar os Recursos aplicados ao TrackFleet: quanto de cada recurso é preciso, quando e de que forma ele é obtido, e como a carga da equipe é acompanhada semana a semana.

1 Estimar os Recursos

A estimativa é bottom-up, somando as atividades do Cronograma nivelado; recursos físicos e virtuais são estimados pelo uso previsto no piloto.

Recurso (EAR)	Quantidade	Quando	Base da estimativa
Enzo (1.1.2)	35 dias de trabalho pleno + 1/3 da jornada no piloto + treinamento (A19) e documentação final (A20) nos 2/3 restantes	31/08 a 12/11	Soma das atividades de que é dono no Cronograma
Kerlon (1.1.3)	36 dias de trabalho pleno + 1/3 da jornada no piloto + treinamento (A19)	31/08 a 12/11	Soma das atividades de que é dono no Cronograma
Gestor de frota (1.1.4)	Cerca de 4 h em entrevistas, 2 h por validação quinzenal, 1 dia de treinamento e uso diário no piloto	A1, validações, A18 e A19	Plano de Engajamento
Rastreadores (1.2.2)	Pelo menos 3 veículos ativos no piloto	28/10 a 12/11	Sinal de alerta da Governança
API do provedor (1.3.1)	1 conta de teste e 1 de produção; 3 meses de assinatura	A partir de 03/09 (A2)	Duração de A7 até o fim do piloto
VPS (1.3.2)	1 servidor pequeno; 4 meses	A partir de 14/10 (A21)	Arquitetura do Documento de Escopo
E-mail, mapas, domínio (1.3.3 a 1.3.5)	Planos gratuitos e 1 domínio	Até o início do piloto	Volume de alertas e acessos do piloto

A primeira estimativa é a menos precisa que o projeto terá: os números são reestimados a cada marco, junto com o registro de riscos.

2 Calendário de Recursos


- **GPs:** 6 horas por dia útil (30 horas por semana) de 31/08 a 12/11, descontados os feriados de 07/09, 12/10 e 02/11.
- **Gestor de frota:** disponível em horário comercial, em datas combinadas com o patrocinador.
- **Provas de outras disciplinas:** não estão no calendário porque as datas não são conhecidas com antecedência; são tratadas como risco (R04) e informadas no check-in assim que marcadas.

3 Adquirir os Recursos

Recurso	Técnica	Como e quando
Os dois GPs	Pré-designação	Definidos no Termo de Abertura; designação por atividade no Cronograma
Tempo do gestor e veículos do piloto	Negociação	Combinados com o patrocinador até 09/10 (risco R05), para o piloto começar em 28/10
API do provedor	Aquisição	Credenciais de teste pedidas na primeira semana (A2); assinatura contratada pelo patrocinador antes de A7
VPS, domínio e e-mail	Aquisição	Contratados até 13/10, antes da configuração da infraestrutura (A21)

4 Histograma de Recursos

Horas por semana de cada GP, comparadas com a capacidade da semana (linha tracejada: 30 horas, ou 24 nas semanas com feriado ou com o fim do projeto).

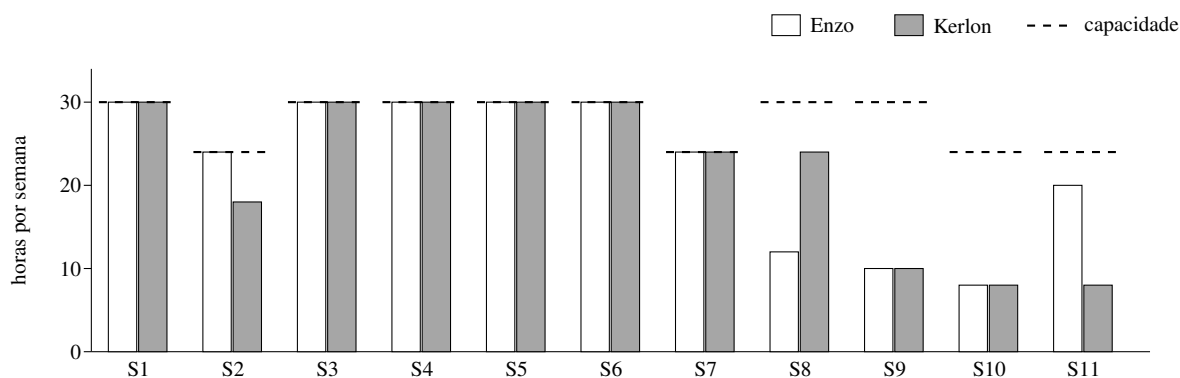

Leitura do histograma:

- **Nenhuma sobrecarga:** nenhuma semana passa da capacidade, porque o Cronograma foi nivelado. Na primeira linha de base, Kerlon aparecia com mapa, cadastros, painel e relatórios na mesma semana — mais de 100% de alocação.
- **Ociosidade planejada:** em S2 Kerlon tem um dia livre (espera o início da arquitetura para começar a autenticação), e de S8 a S11 a carga cai porque o piloto ocupa só um terço da jornada. Essa capacidade livre é a margem para atender correções pedidas pela transportadora no piloto (risco R05) sem consumir o buffer do projeto.
- **Ponto de atenção:** de S3 a S7 os dois estão a 100%. Qualquer demanda externa nesse período — uma prova, por exemplo — vira atraso, o que justifica o risco R04 e o acompanhamento semanal.

5 Monitorar e Controlar os Recursos

- **Equipe:** no check-in semanal, horas planejadas no histograma são comparadas com as realizadas; desvio de mais de um dia em atividade crítica aciona replanejamento da ordem de trabalho.
- **Recursos físicos e virtuais:** cotas da API, do e-mail e dos tiles conferidas mensalmente e antes do piloto; custo mensal comparado ao OpEx previsto em Finanças.
- **Ações corretivas:** se um GP ficar sobrecarregado, a atividade com folga (por exemplo, A13 ou A15) muda de posição na ordem de trabalho antes de qualquer atividade crítica ser mexida.

6 Sustentabilidade e Uso de IA

O princípio de sustentabilidade da 8ª edição aparece em duas decisões: a jornada fixa de 30 horas semanais por GP, sem horas extras planejadas para recuperar atraso (quem protege o prazo é o buffer, não o cansaço da equipe), e a infraestrutura enxuta (um único VPS pequeno em vez de vários serviços gerenciados). A IA foi usada apenas para conferir a soma das cargas e montar o histograma; a responsabilidade pela alocação continua com os GPs, os “A” da RACI.
