

GESTÃO DE PROJETOS

Aula 01 Introdução à Gestão de Projetos

Prof. Eduardo Mildner · Gerente de Projetos

Setrem

O conhecimento faz a diferença

VAMOS FAZER UM PROJETO

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE PONTO ELETRONICO

Quem vai conduzir essa jornada



Eduardo Mildner

Gerente de Projetos · Agilista

- Formado em Tecnologia da Informação
- 16 anos gerenciando projetos
- Experiência em projetos internacionais
- Agilista desde 2016
- Especialista em implantação de ERP



Gerente de Projetos

Atua com projetos desde 2011, especialista em implantação de ERP.



Professor

Em escola técnica e na faculdade, formando novos profissionais.



Criador de treinamentos

Cria e dissemina treinamentos em plataformas online.



Consultor & Instrutor

Ajuda empresas a estruturar sua gestão de projetos.

Nossa jornada neste semestre

06/08	Introdução à Gestão de Projetos	HOJE	15/10	KANBAN	ÁGIL
13/08	Governança		22/10	Trabalho Prático 02	TRABALHO
20/08	Escopo		29/10	Apresentação do Trabalho 02	TRABALHO
27/08	Cronograma		05/11	XP — Extreme Programming	ÁGIL
03/09	Finanças		12/11	Palestra	PALESTRA
10/09	Partes Interessadas		19/11	PRINCE2	
17/09	Recursos		26/11	FDD e DSDM	ÁGIL
24/09	Riscos		03/12	Prova	PROVA
01/10	Trabalho Prático 01	TRABALHO	10/12	O Futuro da Gestão de Projetos	
08/10	SCRUM	ÁGIL	17/12	Prova Substitutiva	PROVA

Como funcionam as aulas



Sempre com um rumo claro

Cada aula começa sabendo aonde queremos chegar — nada de tarefa solta sem propósito.



Teoria + prática

Métodos tradicionais e ágeis, sempre amarrados em exemplos reais do mercado.



Avaliação distribuída

2 Trabalhos Práticos + 1 Prova. Nada de apostar tudo em um dia só.



Participação conta

A aula é discussão, não monólogo. Pergunta, discorda, traz o seu caso.



Você construiria uma casa sem um projeto?

Segura essa pergunta. A gente volta nela no fim da aula.

PARTE 1

O que é gestão de projetos?

Conceitos essenciais antes de colocar a mão na massa.

O que a gente vê na prática



↻ e o ciclo se repete...

Afinal, o que é um projeto?

Um projeto é um **esforço temporário** empreendido para criar um **produto, serviço ou resultado único**.



Temporário

Tem começo, meio e fim. Quando o objetivo é atingido, ele acaba.



Único

Nunca é 100% igual a outro. Sempre tem algo novo e incerto.



Progressivo

Vai sendo detalhado aos poucos, conforme o projeto avança.

E gerenciar projetos, o que é?



É o processo de **liderar o trabalho de uma equipe** para atingir todos os **objetivos do projeto** dentro das **restrições dadas**.




**"O que não pode ser medido,
não pode ser gerenciado."**

William Edwards Deming

Gerenciar é medir, decidir e ajustar o tempo todo.

A tripla restrição

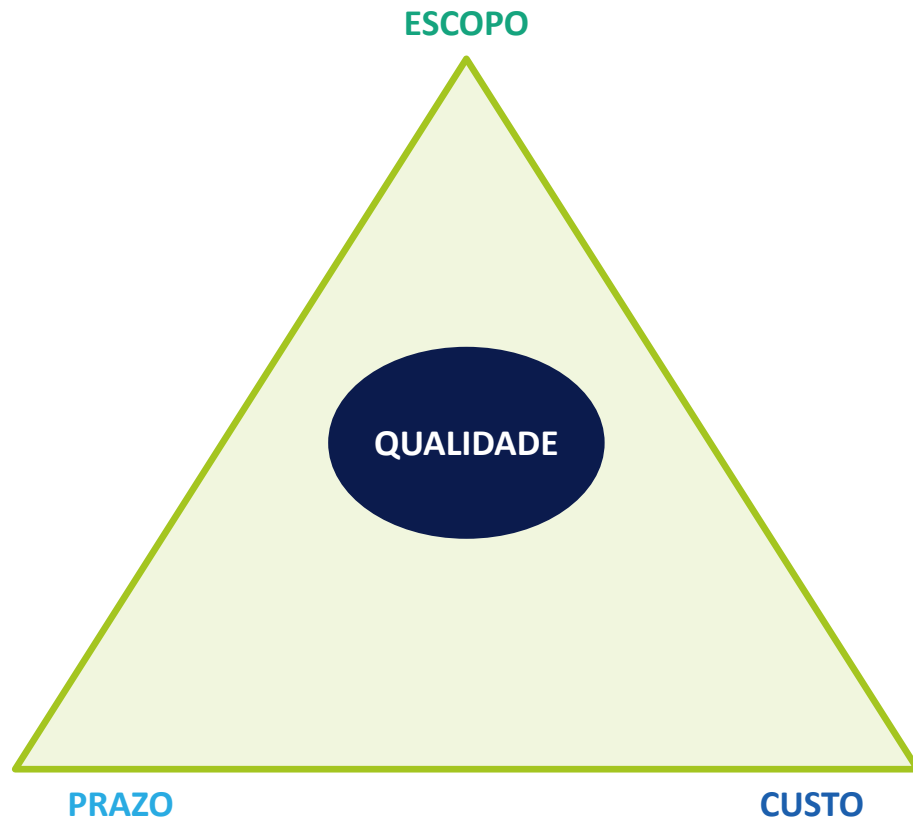

Puxou um, mexe nos outros.

- **Quer mais escopo?** Vai custar mais caro ou levar mais tempo.
- **Quer entregar antes?** Corta escopo ou coloca mais recursos (custo).
- **Quer gastar menos?** Reduz escopo ou estica o prazo.

No meio de tudo está a QUALIDADE ela paga a conta de qualquer desequilíbrio.

O que a gente gerencia num projeto



Escopo

O que entra (e o que fica de fora).



Cronograma

Quando cada coisa acontece.



Custo

Quanto vai custar.



Qualidade

Entregar no padrão certo.



Recursos

Pessoas e materiais.



Riscos

O que pode dar errado.



Aquisições

Compras e fornecedores.



Comunicação

Manter todos alinhados.

Projeto x Operação



PROJETO

Esforço temporário para criar algo único.

- Tem início e fim
- Resultado novo e incerto
- Ligado à estratégia / mudança



OPERAÇÃO

Esforço contínuo que gera saídas repetitivas.

- Não tem fim previsto
- Resultado repetitivo e conhecido
- Sustenta o negócio no dia a dia

Lado a lado

PROJETO	OPERAÇÃO
Ligado a planos estratégicos	Sustenta os negócios
Temporário	Permanente
Original / exclusivo	Repetitivo
Resultado incerto	Rotina
Causa impactos e mudanças	Padrão conhecido
Busca resultados duradouros	Mantém a máquina rodando

Rápido: projeto ou operação?

1. Construir a nova sede da empresa

PROJETO

2. Emitir a folha de pagamento todo mês

OPERAÇÃO

3. Formar a turma de vocês

PROJETO

4. Atender no caixa do supermercado

OPERAÇÃO

5. Lançar um aplicativo novo

PROJETO

6. Fazer o backup diário do servidor

OPERAÇÃO

Exemplos de projetos



Construir uma casa



Desenvolver um sistema



Planejar uma viagem



Campanha política



Criar um protótipo



Organizar um casamento



Produzir um show



Lançar um produto

Plot twist:

a graduação de vocês é um projeto



Escopo

Formar-se em Engenharia da Computação.



Prazo

Os semestres do curso — com data de entrega.



Custo

Mensalidades, livros, tempo investido.



Riscos

Reprovar, trancar, perder prazo de TCC.



Partes interessadas


Você, família, professores, futuro empregador.



Entrega

O diploma na mão. Projeto concluído!

Do menor ao maior

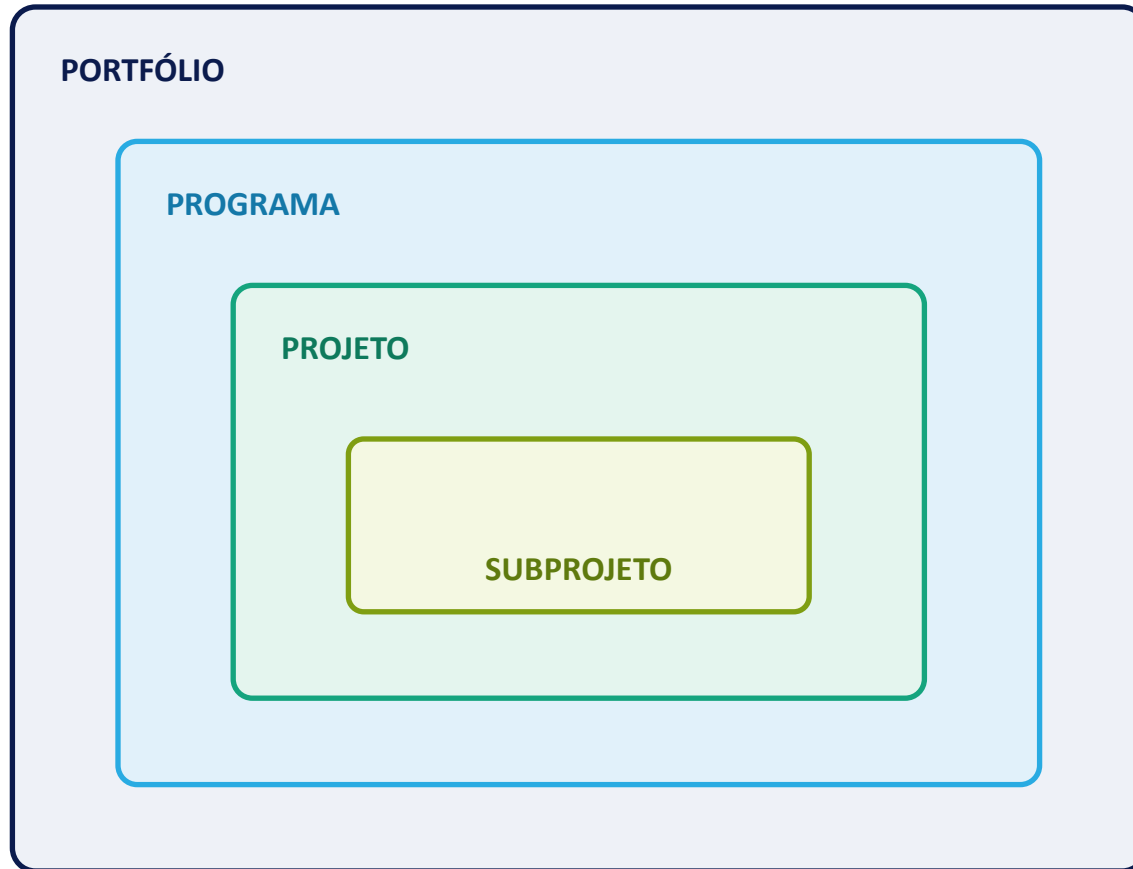

Portfólio

Todos os projetos e programas juntos — a carteira da organização.



Programa

Vários projetos coordenados para um benefício comum.



Projeto

Um esforço temporário com objetivo único.





Subprojeto

Uma fatia do projeto, para gerenciar mais fácil.

Subprojetos

Projeto A

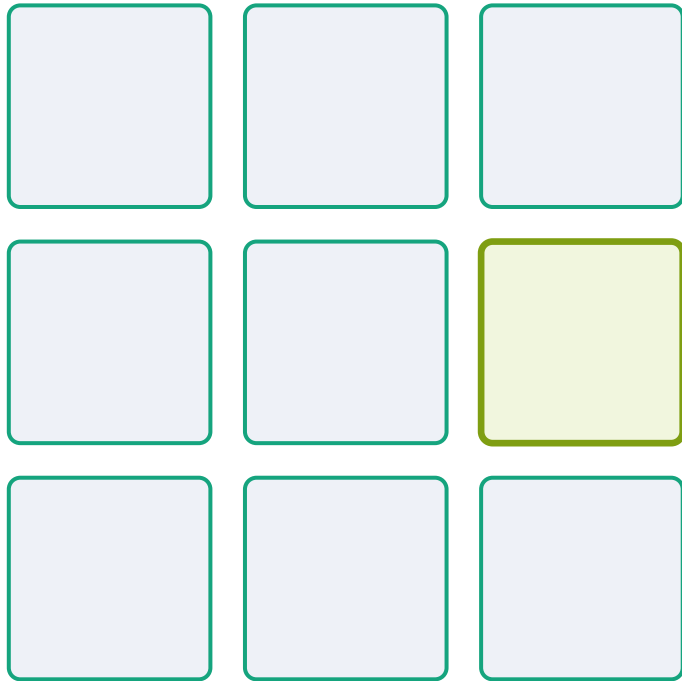

Subprojeto A6



É uma parte menor do projeto total, criada quando ele é dividido em componentes mais fáceis de gerenciar.

Programas



Um grupo de projetos gerenciados de forma coordenada para obter benefícios que não viriam se cada um fosse tocado sozinho.




Exemplo: um loteamento. Cada casa é um projeto; o bairro inteiro é o programa.

PARTE 2

Por onde começar?

Existe um monte de método. Vamos entender o mapa antes de escolher.

A sopa de letrinhas

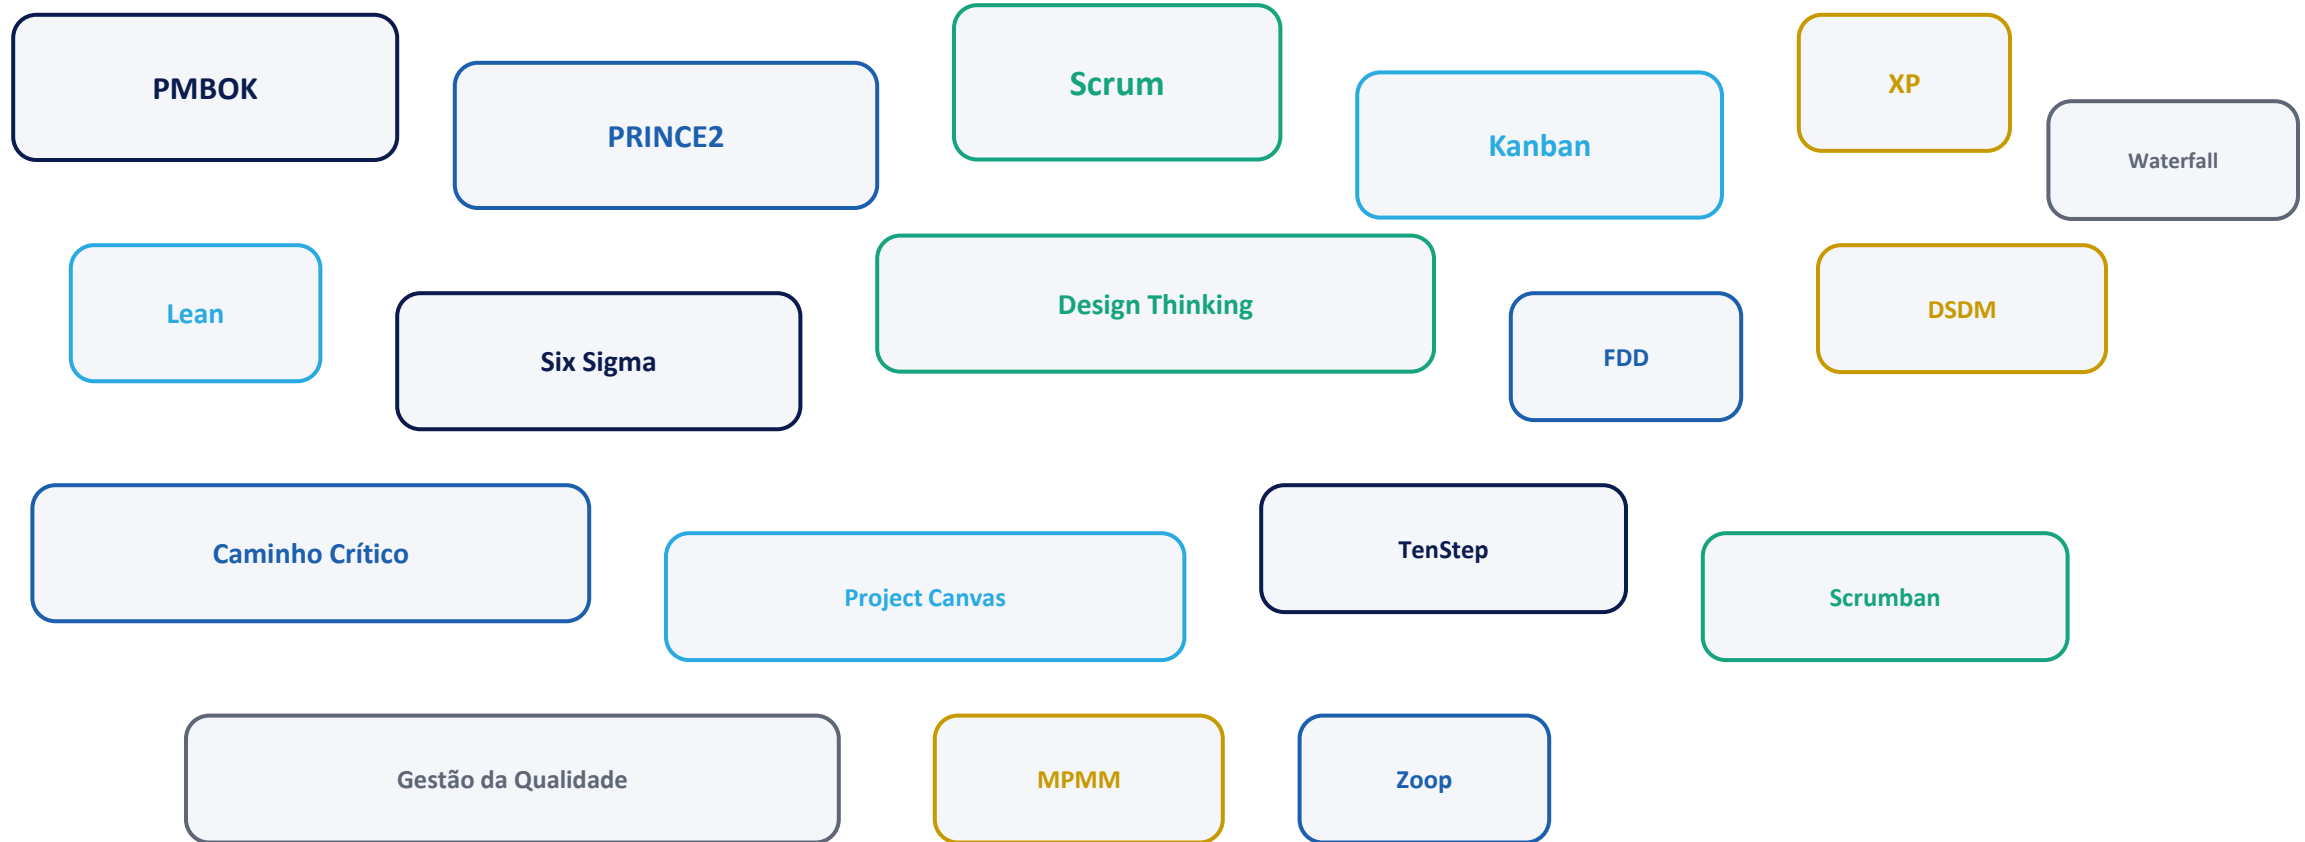

Calma! Você NÃO precisa decorar todas. Neste semestre vamos focar nas principais — e você vai saber quando usar cada uma.

Dois grandes caminhos



Preditivo (Cascata)

- Planeja tudo no início
- Fases em sequência: uma depois da outra
- Ótimo quando o escopo é bem conhecido
- **Ex.: construir uma ponte**



Ágil (Iterativo)

- Entrega em ciclos curtos
- Adapta o plano a cada iteração
- Ótimo quando há incerteza e mudança
- **Ex.: desenvolver um app**



Gerenciar um projeto é certeza de sucesso?

Spoiler: não. Mas aumenta MUITO as chances. Vamos ver por que projetos falham.

A dura realidade

2 em 3

projetos estouram prazo ou
orçamento

~1 em 3

é cancelado antes de ser concluído


#1

causa de fracasso: falha de
comunicação

Números aproximados, com base em estudos recorrentes do setor (ex.: relatórios do tipo CHAOS / pesquisas de maturidade). A ordem de grandeza é o que importa.

% DE ORGANIZAÇÕES QUE CITARAM CADA CAUSA

Por que os projetos falham?

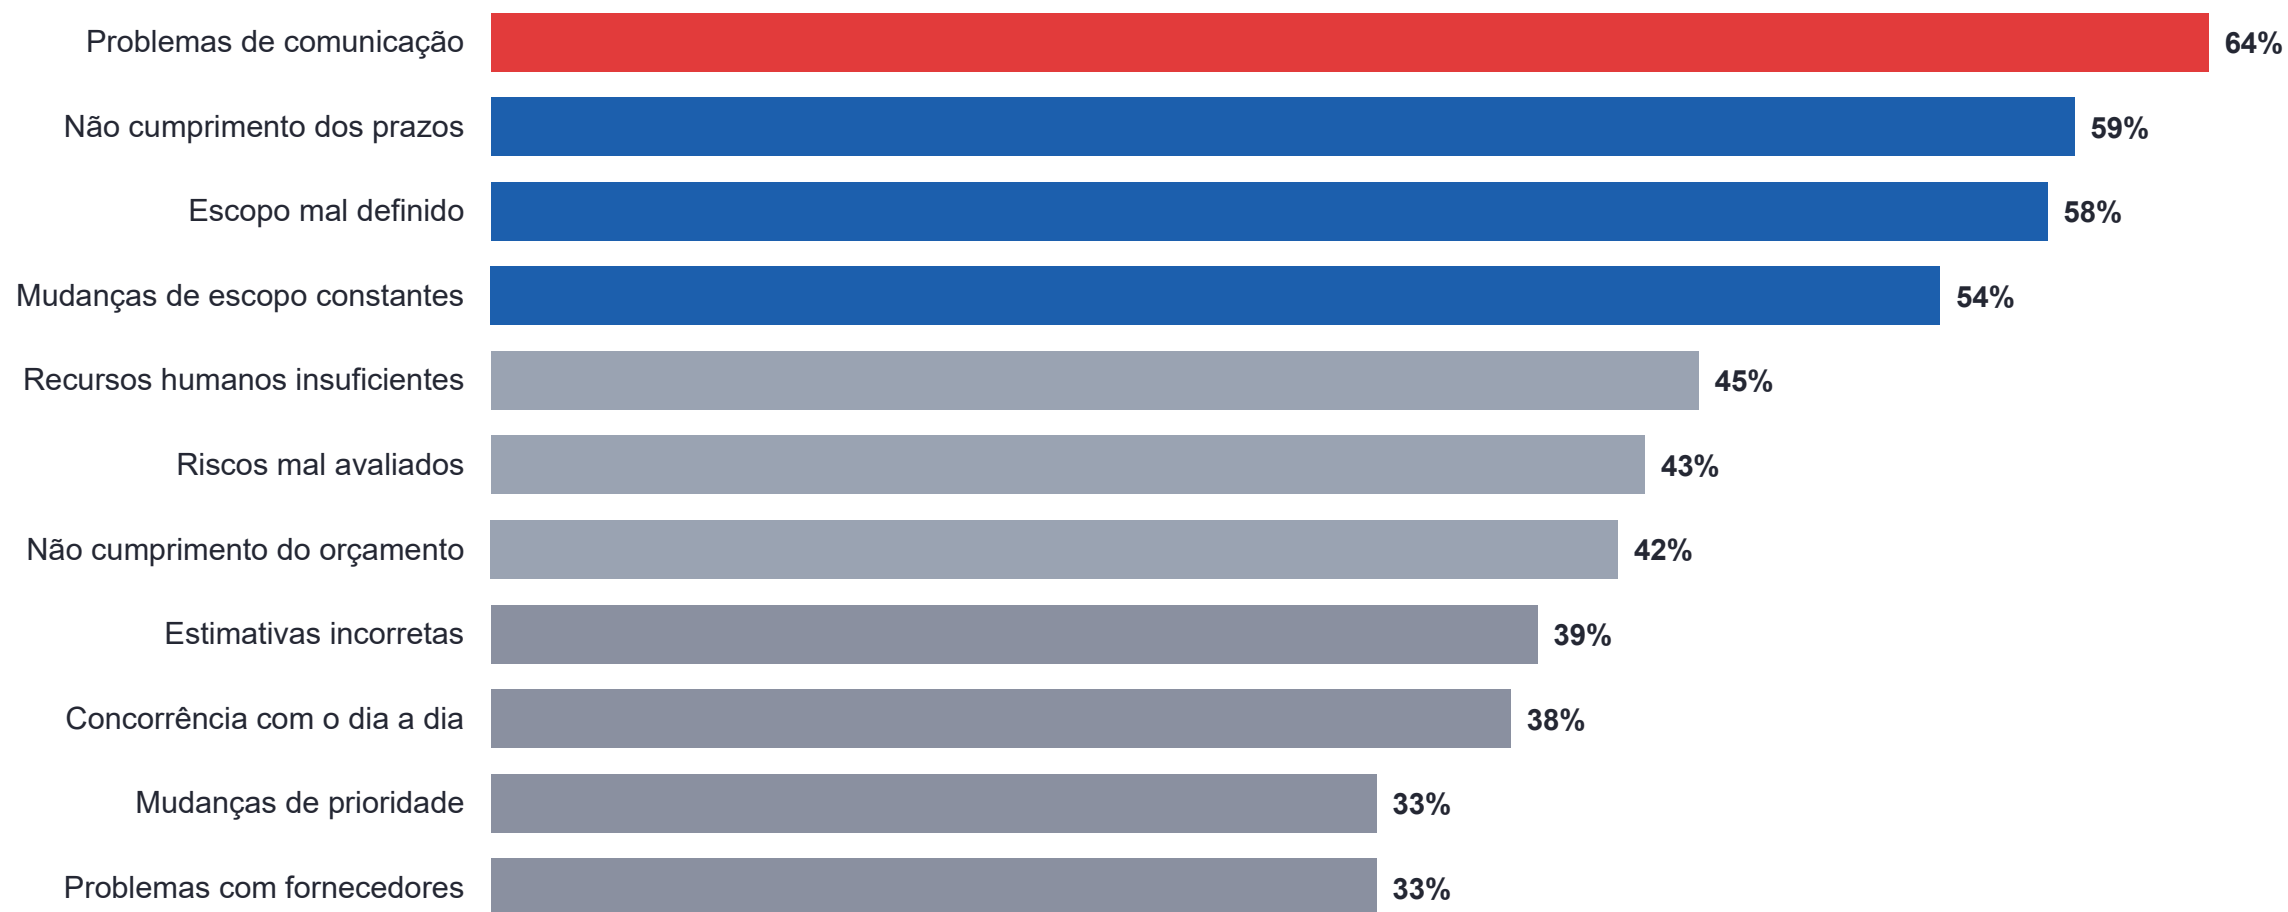

O clássico do balanço



Moral: sem comunicação e escopo claros, cada um entrega uma coisa diferente. 🤔

#1 · Falta de comunicação



"O verdadeiro problema da comunicação é que não escutamos para compreender, e sim para responder."



Ruído

A mensagem chega distorcida a cada pessoa.



Silos

Cada um sabe de um pedaço; ninguém do todo.



Suposição

Todo mundo "achou" — ninguém confirmou.

#2 • Objetivos não claros



Se ninguém sabe exatamente aonde quer chegar, qualquer caminho serve — e nenhum leva ao destino.



Sem escopo

Faltam requisitos e limites do que fazer.



Tarefas soltas

Atividades picadas, sem origem nem sentido.



Sem propósito

O "porquê" do projeto nunca foi definido.

#3 · Estimativas não confiáveis



Prometer prazo e custo "no chute" é o jeito mais rápido de estourar os dois.



Prazos errados

Tempo de tarefa estimado sem base real.



Custo subestimado

A conta final não fecha com o orçado.



Recursos de menos

Falta gente ou material no meio do caminho.

#4 · Ignorar os riscos



Risco que você não planejou vira crise. Risco que você planejou vira só mais uma tarefa.



Não enxergar

Ninguém listou o que pode dar errado.



Ser pego de surpresa

O problema estoura sem plano B.



Sem resposta

Não há ação preparada para reagir.

#5 • Mudanças sem controle



Mudar faz parte. Mudar sem critério, o tempo todo, transforma o projeto num alvo que nunca para de andar.



Retrabalho

O que estava pronto vira inútil e refaz-se.



Escopo inflando

Vai crescendo sem revisar prazo e custo.



Metas movendo

Objetivos mudam sem repactuar o plano.

#6 • Falta de visibilidade



Não dá para gerenciar o que você não enxerga. Sem visibilidade, o projeto vira caixa-preta.



Cronograma cego

Sem acesso ou totalmente desatualizado.



Plano ≠ real


O que foi projetado não bate com o executado.



Pendências soltas

Ninguém acompanha o que ficou em aberto.

Ciclo de vida do projeto

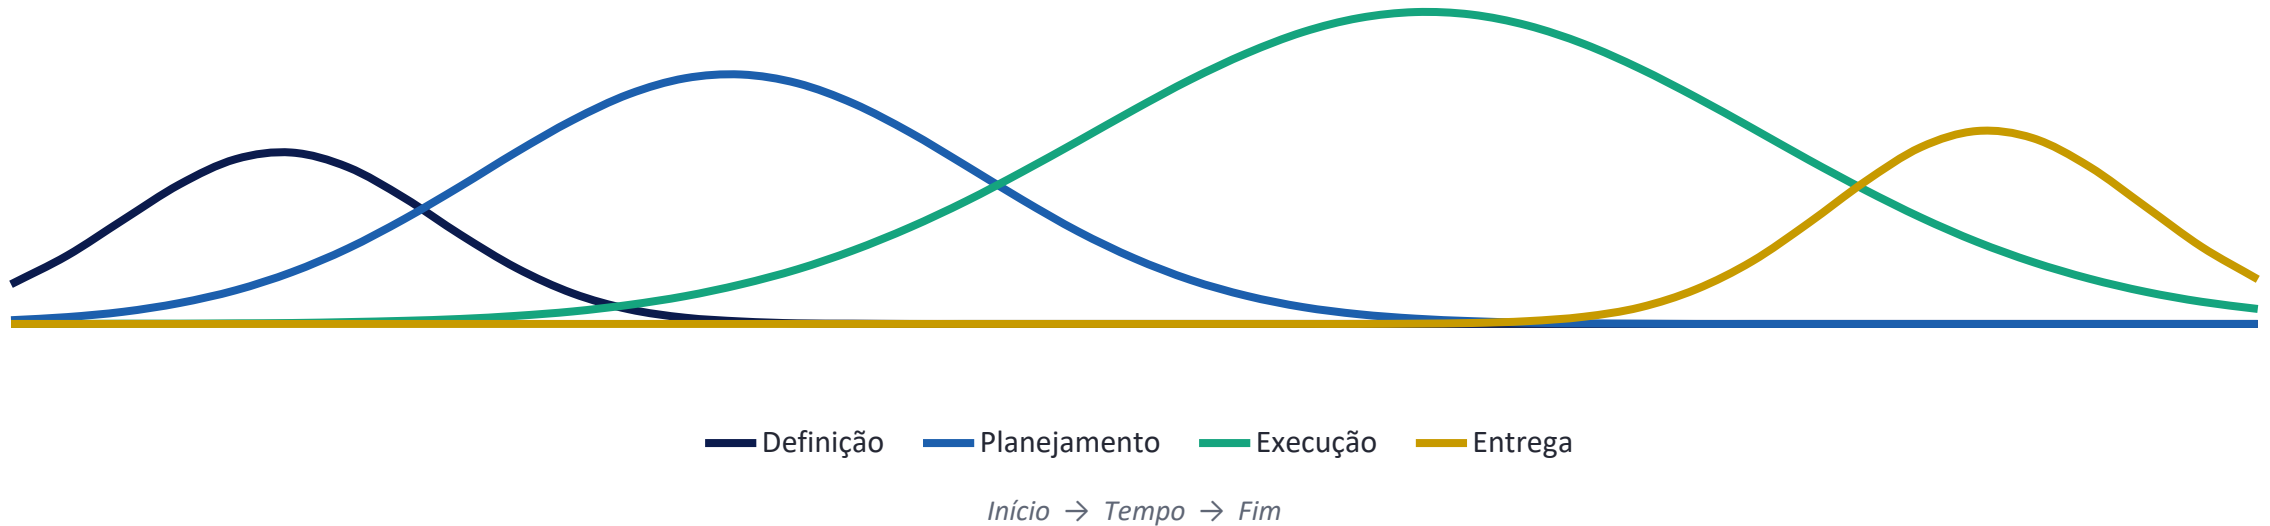

Definição

- Objetivos
- Especificações
- Tarefas
- Responsáveis

Planejamento

- Cronograma
- Orçamento
- Recursos
- Riscos e equipe

Execução

- Status
- Mudanças
- Qualidade
- Previsões

Entrega

- Treinar cliente
- Transferir docs
- Liberar equipe
- Lições aprendidas

O vale do desespero



Aqui muita gente DESISTE. O segredo é atravessar o vale — não parar no fundo dele.

Case real: quando dá errado



O que aconteceu

- Escopo ambicioso demais para o prazo
- Testes e integração subestimados
- **~16 meses de atraso na abertura**
- **Centenas de milhões de US\$ a mais**
- **O sistema automático acabou abandonado**

As lições (que já vimos hoje)

- ✓ Escopo realista importa
- ✓ Estimar com folga e testar
- ✓ Gerenciar risco e integração
- ✓ Comunicação entre as partes



Para assistir em casa:

Metrô de Seattle — youtu.be/wtwx-dEQuWk

O DNA dos projetos que dão certo



Escopo claro

Todos sabem o que é (e o que não é) o projeto.



Comunicação forte

Informação flui; ninguém fica no escuro.



Riscos sob controle

O que pode dar errado já tem plano.



Entregas frequentes

Valor em pedaços, cedo e sempre.



Patrocínio ativo

A liderança apoia e remove obstáculos.



Visibilidade

Status e pendências sempre à vista.

E onde entra o Gerente de Projetos?



O GP é quem transforma uma ideia bagunçada em entrega organizada — liderando pessoas e equilibrando escopo, prazo, custo e qualidade.



Comunicação

Traduz e alinha todo mundo.



Liderança

Guia a equipe e resolve conflitos.



Organização

Mantém plano, prazo e escopo no trilho.



Negociação

Equilibra interesses e restrições.



Visão do todo

Enxerga riscos e o quadro completo.



Adaptação

Muda o plano quando a realidade muda.

Exercício prático — em grupos



Cenário: a coordenação de Engenharia da Computação quer um sistema online para agendar laboratórios e equipamentos. Hoje isso é feito na mão, em planilhas desorganizadas.

1

Projeto ou operação?

Classifiquem e justifiquem com as características que vimos hoje.

2

O caos na prática

Escolham 3 causas de fracasso e descrevam como cada uma apareceria aqui.

3

Primeiros passos

Quais 2–3 ações iniciais (começando pela Declaração de Escopo) dariam o rumo?

O que levamos de hoje



Projeto é temporário e único

Diferente de operação, que é contínua e repetitiva.



Escopo, prazo e custo se puxam

Mexe em um, os outros (e a qualidade) sentem.



Comunicação é a falha nº 1

Escopo e comunicação derrubam a maioria dos projetos.



Gestão reduz risco, não elimina

Mas aumenta MUITO as chances de sucesso.



Comece com um rumo claro

A Declaração de Escopo dá direção desde o dia zero.



Para ir além

TEDx — Jorge Audy

"Gerenciamento de projetos aplicado à vida"

youtu.be/7na7QNMWbXg

Case Metrô de Seattle

youtu.be/wtwx-dEQWk

Carreira de Gerente de Projetos

<https://www.youtube.com/watch?v=3o4yMHP4DP0&t=162s>

Quizz...

Ninguém constrói uma casa sem projeto.
Seus projetos merecem o mesmo cuidado.



Próxima aula (13/08)

Governança

Dúvidas? Vamos conversar.

Setrem

Prof. Eduardo Mildner · Gestão de Projetos · O conhecimento faz a diferença
