

GESTÃO DE PROJETOS · AULA 02

Governança de Projetos

A 1ª área de desempenho do PMBOK® Guide — 8ª edição

Prof. Eduardo Mildner

Engenharia da Computação · SETREM

13 de agosto de 2026





Onde estamos: as 7 áreas do PMBOK 8

O PMBOK 8 organiza o trabalho em 7 domínios de desempenho. Nosso semestre segue exatamente essa ordem — e hoje começamos pela 1ª.



Por que Governança vem primeiro? Porque ela define **quem decide o quê, com quais critérios e como o valor será medido**. Sem isso, escopo, prazo, custo e risco ficam sem “dono” e sem regra. Governança é a estrutura que sustenta todos os outros domínios.



OBJETIVOS DA AULA

O que você vai levar desta aula



Entender o que É — e o que NÃO é — governança

Separar governança de relatório e de burocracia.



Escolher o modelo certo e calibrar

Estruturada ↔ autogovernança, sem exagero nem falta.



Aplicar os 9 processos de governança

Da iniciação ao encerramento, na prática.



Diferenciar governança de gestão

Quem decide as regras × quem executa o trabalho.



Definir papéis, autoridade e escalonamento

Quem decide o quê e quando acionar o comitê.



Montar a governança de um projeto de TI

Um checklist que você usa já no próximo trabalho.



CONTEXTO RÁPIDO

PMBOK® 8 em um slide

Lançado em nov/2025. Retoma a estrutura prática (processos com ITTOs) mantendo a flexibilidade da 7ª edição. Foco em entrega de valor, IA e sustentabilidade.

6

Princípios

o “porquê”

7

**Domínios de
desempenho**

o “o quê”

5

Áreas de foco

o “quando”

40

Processos

o “como”

Governança é o 1º dos 7 domínios — e o maior deles. Ela é a única área que percorre todas as 5 áreas de foco (Iniciar → Planejar → Executar → Monitorar & Controlar → Encerrar), amarrando o projeto do começo ao fim.

UMA CENA MUITO COMUM...

A reunião de comitê que não decide nada



Sala cheia de líderes seniores diante de um painel de indicadores verdes, amarelos e vermelhos. Todos concordam com os verdes. Franzem a testa nos vermelhos. O gerente explica por que um prazo foi perdido, promete “melhorar” — e a reunião termina.



Nenhuma decisão foi tomada. Nada mudou.

Muita gente chama isso de “governança”. Não é. Isso é **relatório caro**.



DEFINIÇÃO

O que é Governança

DEFINIÇÃO — PMBOK® 8

Governança é o conjunto de estrutura, funções e processos que orientam as decisões e atividades do projeto para otimizar a entrega de valor.



Em outras palavras

É o sistema que define **QUEM** decide **O QUÊ**, **COMO** e com base em **QUAIS CRITÉRIOS** — para o projeto entregar valor com integridade, transparência e rastreabilidade.



Governança não é o mesmo que Gestão

GOVERNANÇA

- Define regras, autoridade e critérios de decisão
- Garante o alinhamento com a estratégia
- Aprova (ou barra) mudanças relevantes
- Foca em valor e em accountability

Quem: patrocinador · comitê diretor · PMO

GESTÃO

- Planeja e executa o trabalho do dia a dia
- Coordena equipe, tarefas e entregas
- Resolve problemas operacionais
- Foca em prazo, escopo e execução

Quem: gerente de projeto + time


↳ *A governança define o campo e as regras do jogo; a gestão joga a partida.*

Não é um portão. É a espinha dorsal.

Governança não fica “acima” do trabalho, vigiando de longe. Ela conecta os outros 6 domínios — é holística e integradora, e usa dados para apoiar decisões.

A analogia do prédio

Arquitetura, materiais, equipes e alvarás correm ao mesmo tempo. Alguém precisa garantir que a estrutura se sustente e sirva ao propósito original. Essa pessoa não é um fiscal de portão — é o integrador.

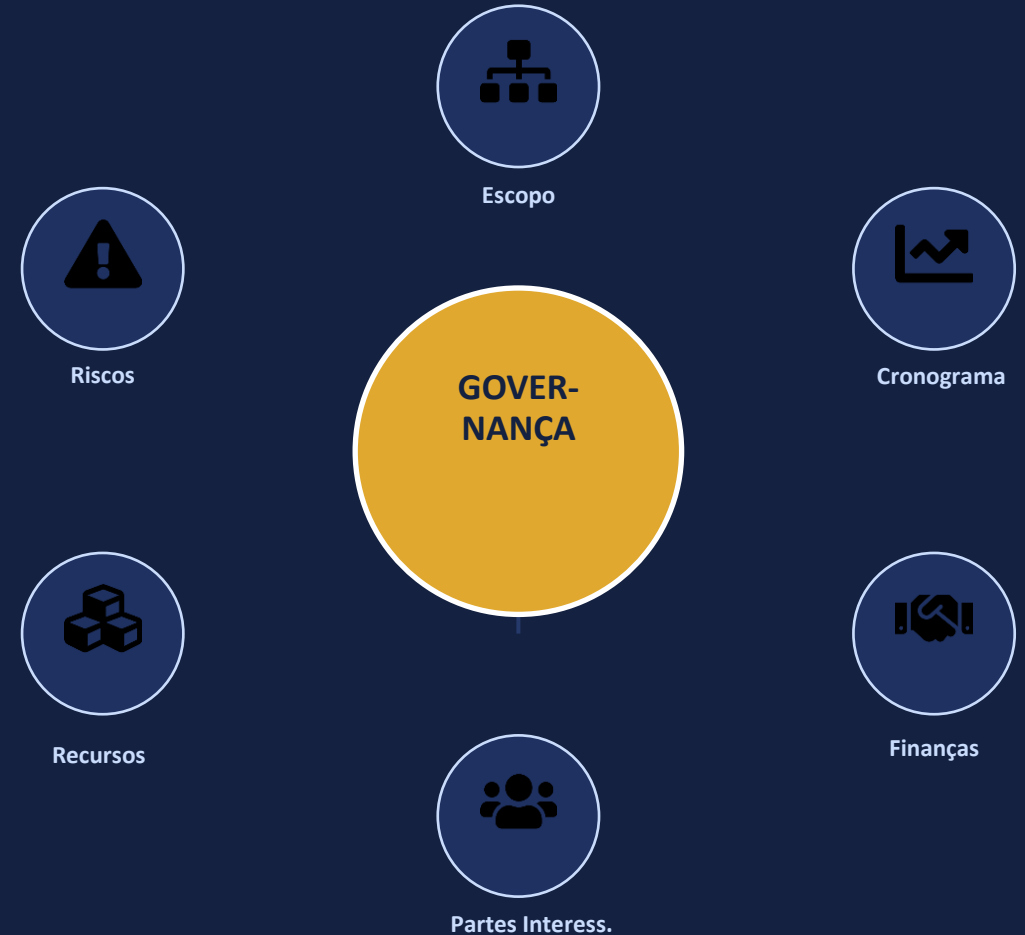



PONTO DE PARTIDA

As regras já existem antes do seu projeto

A governança do seu projeto é moldada pela organização e pelos stakeholders. Ela não “começa” quando o projeto começa as regras já estão lá, esperando por você.



Modelo de governança da organização

Políticas, padrões, PMO e alçadas de aprovação já definidos pela empresa.



Stakeholders — clientes e usuários

Requisitos contratuais, expectativas de valor e critérios de aceite.



Órgãos reguladores e normas

Leis e normas externas/internas que restringem e orientam decisões.

Exemplo (Eng. Computação): um sistema que trata dados pessoais já nasce sob a **LGPD**; um sistema bancário, sob normas do Banco Central. Mapeie essas exigências **antes** de desenhar a solução.



Dois modelos, um espectro

◀ ESTRUTURADA

HÍBRIDA

AUTOGOVERNANÇA ▶



Governança Estruturada

projetos mais preditivos

- Oversight formal por constituintes internos/externos
- Papéis definidos: patrocinador, PMO, comitê, GP
- Cadência e aprovações formais
- Ideal para ambientes regulados e de alto risco



Autogovernança

projetos mais adaptativos / ágeis

- O time é coletivamente responsável pelo desempenho
- Governança leve, com fronteiras (guardrails) claras
- Decisões distribuídas, sem “dono” formal único
- Risco: decisão fragmentada → falta de direção




MODELO 1

Governança Estruturada na prática




Quando usar

Projetos preditivos, ambientes regulados, alto risco ou alto valor, com múltiplos stakeholders e forte exigência de conformidade.



Papéis típicos

Patrocinador executivo · Líder de PMO · Comitê / Conselho de governança · Gerente de projeto.



Como funciona

Constituintes governam o desempenho conforme requisitos da organização: cadência formal, revisões de risco, aprovações e controle de mudanças.



Exemplo real

Implantação de um ERP em uma indústria.

- Comitê mensal aprova marcos e libera fases
- Mudanças de escopo passam por comitê de mudanças
- Cutovers seguem cronograma preditivo
- Auditorias garantem conformidade



MODELO 2

Autogovernança na prática



Quando usar

Projetos adaptativos/ágeis, times autônomos, alta incerteza e necessidade de rapidez para decidir.



Como funciona

O time é coletivamente responsável por otimizar o desempenho e garantir a entrega de valor — com governança leve e guardrails claros.



O grande risco

Decisão fragmentada: decisores agem de forma conflitante → falta de direção e de accountability. Sem guardrails, autonomia vira caos.



O antídoto: guardrails

- Objetivos comuns claros e mensuráveis
- Indicadores antecedentes (leading)
- Mecanismos de feedback contínuos

Ex.: squad de um app decide a arquitetura, mas dentro de uma Definition of Done, limites técnicos e OKRs.



TAILORING

Quanta governança é 'a certa'?



Governança de MENOS

Desalinhamento estratégico, decisões conflitantes e problemas de desempenho.



O ponto de equilíbrio

Alinhamento + conformidade + valor, com o mínimo de atrito.



Governança de MAIS

Desperdício de recursos, lentidão e burocracia que não agrega valor.

Adapte ao contexto: setor, regulação, tamanho, risco e cultura. Ágil → governança leve com fronteiras claras. Projeto multinacional/regulado → conformidade com várias normas e agências.



Teste decisivo: se a sua governança não te ajuda a tomar decisões melhores, não é governança — é burocracia.



ESTRUTURA

Quem é quem na governança



Patrocinador (Sponsor)

Dono do business case. Remove obstáculos e tem a palavra final sobre continuar ou parar.



Comitê Diretor / Conselho

Dá direção estratégica, aprova mudanças maiores e resolve escalonamentos.



PMO

Define padrões e métodos, dá suporte e garante consistência entre projetos.



Gerente de Projeto

Conduz o dia a dia: planejamento, engajamento, entregas e comunicação.



Compliance / Jurídico

Garante aderência a normas legais, regulatórias e políticas internas.



Product Owner (ágil)

Prioriza o backlog e representa o valor de negócio junto ao time.



DECISÃO

Autoridade de decisão & escalonamento

O que o GP decide sozinho

- Realocar folga interna da equipe
- Ajustes operacionais dentro da baseline
- Sequenciamento de tarefas do time

O que sobe ao patrocinador / comitê

- Mudança de prazo, orçamento ou escopo
- Riscos que ameaçam objetivos estratégicos
- Conflitos entre áreas ou por recursos



Escalonar não é fraqueza. Tentar resolver algo acima da sua alçada costuma ser o erro; acionar patrocinador, comitê ou PMO no momento certo é o acerto. Uma boa governança deixa esse caminho claro de antemão.



RACI: acabando com o 'de quem é isso?'

R**Responsible** *faz o trabalho***A****Accountable** *responde pelo resultado***C****Consulted** *é consultado***I****Informed** *é informado*

Atividade	Patroc.	GP	Time Dev	PO
Aprovar o escopo	A	R	C	C
Definir a arquitetura	I	A	R	C
Priorizar o backlog	C	C	I	A
Homologar a entrega	A	R	C	C

Regra de ouro: apenas UM “A” (accountable) por atividade — mas vários podem ser R, C ou I.



Governança que funciona tem 3 componentes

1



Métricas-alvo

Claramente alinhadas aos objetivos estratégicos.
Medem RESULTADO (valor entregue), não
esforço (horas gastas).

2



Sinalização clara

Indicadores antecedentes (leading) e sistemas
de alarme que mostram se estamos nos
aproximando da meta — a tempo de agir.

3



Feedback eficaz

Permite avaliar as decisões tomadas, aprender
com o resultado e melhorar a PRÓXIMA decisão.

↳ É isto que transforma governança de burocracia rígida em um sistema inteligente que aprende.



Meça resultado, não movimento

✓ Métricas de RESULTADO (outcome)

- Valor de negócio entregue
- Satisfação e adoção pelo cliente/usuário
- Redução de retrabalho / de defeitos em produção
- Nº de NOVOS usuários (não só de acessos)

✗ Métricas de INSUMO (input)

- Utilização (% de ocupação) da equipe
- % de membros que fizeram um treinamento
- Aderência a um conjunto de padrões
- Volume de páginas vistas (vanity metric)



Um time pode estar 100% ocupado e entregar zero valor estratégico. Ocupação mede movimento — não resultado.



CUIDADO

As 6 armadilhas ao medir desempenho



Lei de Goodhart

Quando uma métrica vira meta, ela deixa de ser uma boa métrica.



Efeito Hawthorne

O simples ato de medir já muda o comportamento (foco em volume, não em valor).



Vanity metrics

Números que impressionam, mas não ajudam a decidir nada.



Desmoralização

Metas inatingíveis derrubam a moral: o time falha continuamente.



Viés de confirmação

Enxergamos só os dados que confirmam o que já acreditávamos.



Correlação ≠ causa


Atraso + estouro de orçamento não implica que um causou o outro.



MÃO NA MASSA

Governança na prática: os 9 processos

É o maior domínio do PMBOK 8 — percorre todo o ciclo de vida, da iniciação ao encerramento, nas 5 áreas de foco.

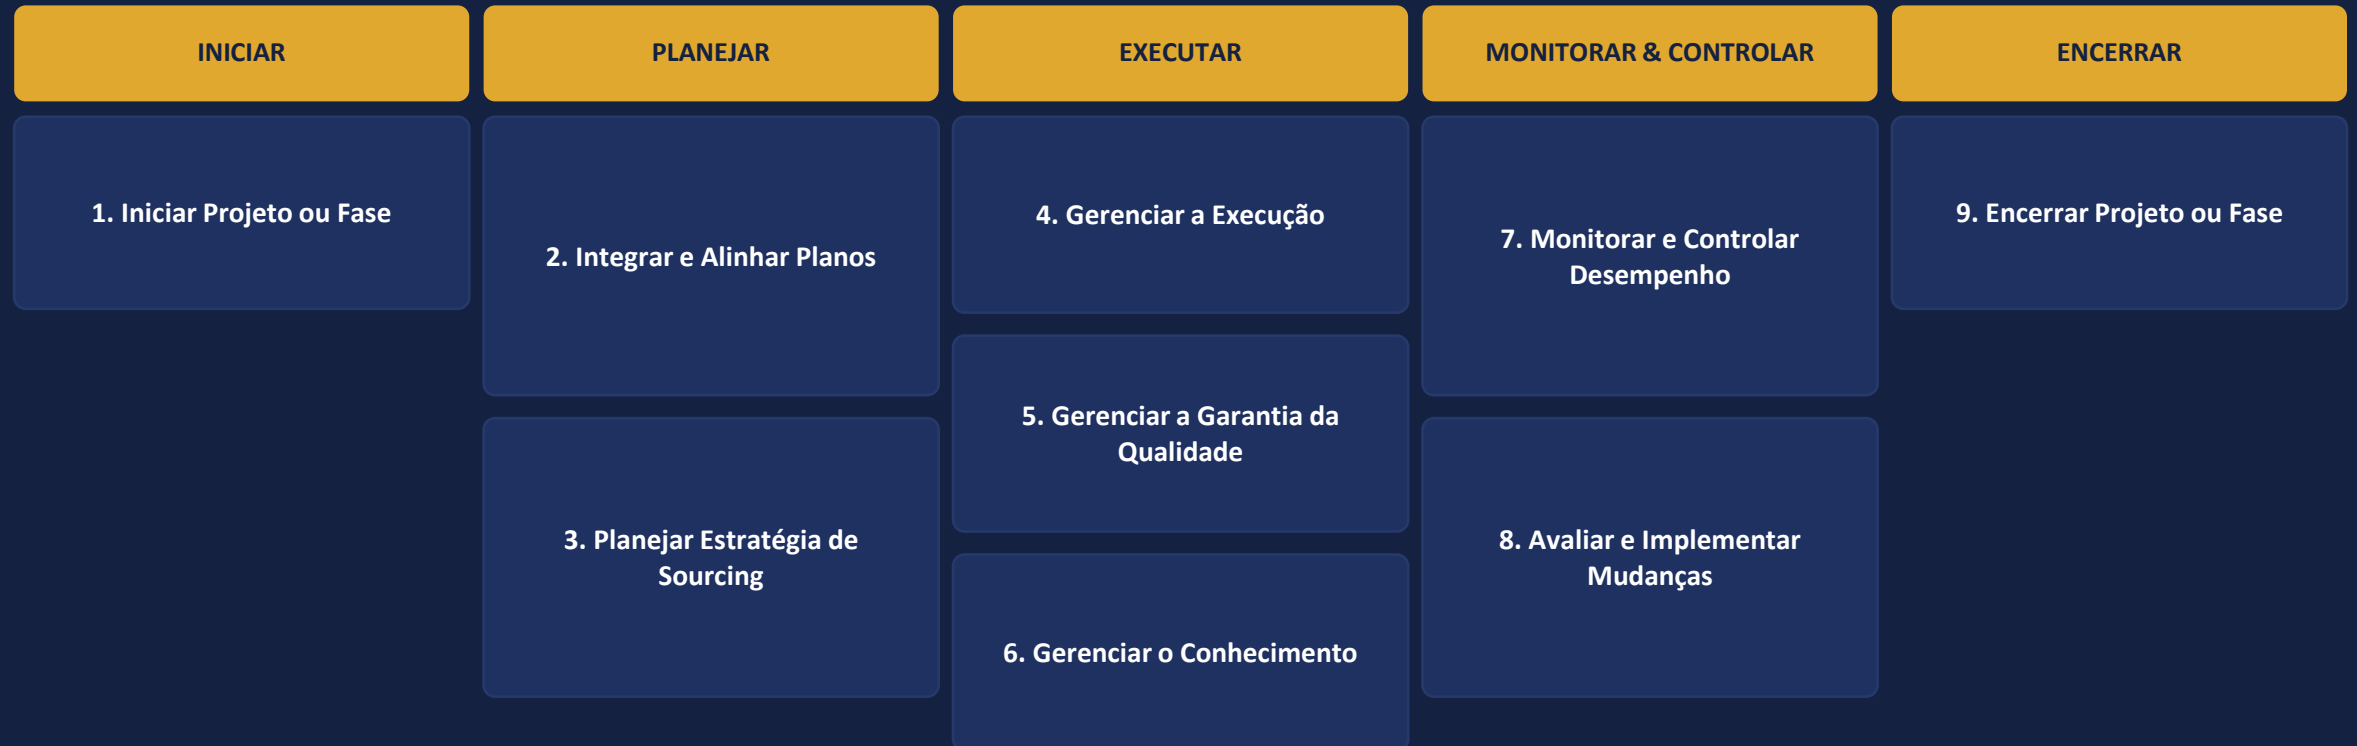



Iniciar Projeto ou Fase



O que é

Autoriza formalmente o início e dá ao GP autoridade para alocar recursos — por meio do termo de abertura (project charter) ou documento similar.



Por que importa

Cria um elo direto entre o projeto, o business case e os objetivos estratégicos da organização.



No mundo ágil

O charter pode ser leve: de uma folha ou visão concisa a um documento moderadamente detalhado.



Exemplo (Eng. Comp.)

Termo de abertura de um sistema acadêmico:

- Patrocinador: Coordenação do curso
- Objetivo e valor esperado
- Restrições: LGPD, prazo do semestre
- GP nomeado + autoridade sobre recursos



Integrar Planos & Estratégia de Sourcing

2 · Integrar e Alinhar Planos

Consolidar todos os componentes em um plano ÚNICO — que diz como o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado.

Regra de bolso: planeje o suficiente para avançar — nem mais detalhado que o necessário.

3 · Estratégia de Sourcing

A conversa central é a decisão **make-or-buy** (fazer ou comprar):

Insourcing

Usa expertise interna. Mais controle e integração estratégica.

Outsourcing

Usa expertise externa. Libera capacidade e capital.

Ex.: *desenvolver o módulo de pagamento internamente × contratar um gateway pronto.*



PROCESSOS 4, 5 E 6 · EXECUTAR

Execução · Qualidade · Conhecimento



4 · Gerenciar a Execução

Liderar e realizar o trabalho definido no plano e implementar as mudanças aprovadas para atingir os objetivos.



5 · Garantia da Qualidade

QA = usar bem os PROCESSOS (dar confiança de que o resultado atenderá requisitos). Não confundir com QC (deliverables).



6 · Gerenciar o Conhecimento

Explícito (codificável) × tácito (na cabeça das pessoas). Objetivo: converter tácito em explícito quando possível.

Traduzindo para software: QA = code review e Definition of Done · QC = testes que validam o requisito · Conhecimento = registrar decisões de arquitetura (ADRs) para não depender de uma só pessoa.



Monitorar/Controlar & Gerir Mudanças

7 · Monitorar e Controlar Desempenho

Acompanhar, revisar e reportar o progresso. Monitorar (coletar, medir, avaliar) + controlar (ações corretivas/preventivas, replanejar).


“Monitorar sem controlar é apenas observação passiva.”

8 · Avaliar e Implementar Mudanças

Preditivo: após a baseline, toda mudança passa por processo formal — o CCB (Comitê de Controle de Mudanças) aprova, adia ou rejeita.

Ágil: gestão de backlog — mudanças priorizadas continuamente, sem solicitação formal.

FLUXO PRÁTICO DE UMA MUDANÇA





Encerrar Projeto ou Fase



O que é

Finalizar TODAS as atividades — de projetos bem e malsucedidos, fases, releases, iterações ou contratos.



Confirmar o valor

Verificar o quanto de valor — ou de capacidade de entregar valor — foi de fato alcançado.



Encerramentos antecipados

Inclui investigar e documentar as razões de um projeto encerrado antes da conclusão.

BOAS PRÁTICAS

- Lições aprendidas registradas
- Transição de conhecimento
- Aceite formal do patrocinador
- Liberação de recursos e contratos

Ex.: encerrar a fase 1 do sistema — aceite, retrospectiva e backlog de melhorias para a fase 2.



Ágil ≠ 'sem governança'

Ágil é autogovernança: o time tem autonomia para decidir e gerir o trabalho sem burocracia pesada — com governança leve e fronteiras (guardrails) claras. É governança adaptativa, não ausência de governança.

TRADUZINDO A GOVERNANÇA PARA O MUNDO ÁGIL

Termo de abertura (charter) → **Visão do produto**

Baseline + CCB formal → **Backlog + Product Owner**

Relatório de status → **Demo / Sprint Review**

Plano detalhado up-front → **Planejamento contínuo por sprint**

Controle de mudanças → **Refinamento de backlog**

Auditoria de conformidade → **Definition of Done + guardrails**



ESTUDO DE CASO

O comitê pediu para pausar o projeto

CENÁRIO

Você é GP em uma fintech, num projeto de conformidade regulatória. No comitê, o presidente pede pausar o projeto por 30 dias para liberar recursos a um programa maior. Você acredita que a pausa fará perder um prazo regulatório — o que gera multas altas para a empresa.

Qual a atitude MAIS adequada, segundo a Governança do PMBOK 8?

- A Rejeitar a pausa e seguir, alegando “override” legal da obrigação regulatória
- B Obedecer ao comitê sem questionar — eles é que mandam
- C Esperar o descumprimento acontecer para então escalar o problema
- D Preparar análise de impacto quantificando o risco, apresentar ao patrocinador/comitê e pedir decisão documentada com accountability**





Montando a governança de um projeto de TI

Projeto-exemplo: novo sistema de matrícula. Monte a governança em 6 passos:

1

Mandato & business case

Problema, objetivos, critérios de sucesso e valor esperado → termo de abertura.

2

Modelo & papéis

Escolher estruturada/híbrida; definir patrocinador, comitê, GP e PO; montar RACI.

3

Autoridade & escalonamento

O que o time decide × o que sobe ao comitê; caminho claro de escalonamento.

4

Cadência & artefatos

Comitê mensal, revisões de risco, demos; um plano integrado único.

5

Métricas & sinais

2–3 métricas de RESULTADO + indicadores antecedentes + feedback.

6

Mudanças & conformidade

Fluxo de mudança (CCB ou backlog) + requisitos (LGPD/segurança).



CONSOLIDANDO

Erros comuns & checklist para começar

EVITE

- ✗ Confundir governança com relatório de status
- ✗ Comitê que se reúne mas não decide nada
- ✗ Métricas de vaidade / medir só esforço
- ✗ Governança pesada em um time ágil
- ✗ Nenhum “A” (accountable) definido
- ✗ Escalonar tarde demais, após o dano

CHECKLIST

- ✓ Business case ligado à estratégia?
- ✓ Papéis e matriz RACI definidos?
- ✓ Autoridade e escalonamento claros?
- ✓ 2–3 métricas de resultado + sinais?
- ✓ Fluxo de mudanças (CCB ou backlog)?
- ✓ Cadência de decisão combinada?



RESUMO DA AULA

4 mensagens para levar



Governança = estrutura + funções + processos para otimizar valor: quem decide o quê, como e com quais critérios.



Não é gestão nem relatório: é a espinha dorsal que conecta os outros 6 domínios do projeto.



Escolha o modelo (estruturada ↔ autogovernança) e calibre — nem demais, nem de menos.



3 componentes: métricas-alvo, sinalização e feedback. 9 processos, da iniciação ao encerramento.

“A governança serve ao projeto — não à burocracia.”

PRÓXIMA AULA · 20/08

Escopo

O 2º domínio: definir o que entra — e o que fica de fora — do projeto.



Para casa: escolha um projeto de software e desenhe a sua governança — papéis + matriz RACI, 3 métricas de resultado e o fluxo de mudanças. Traga na próxima aula.



MÃO NA MASSA · SEGUNDA PARTE DA NOITE

Acabou a teoria. Agora é com vocês.

Vocês vão criar, do zero, a GOVERNANÇA de um projeto — passo a passo. Não se preocupem: cada passo tem um exemplo pronto para seguir.



Trabalho em DUPLAS



6 passos guiados + exemplo em cada um




Entrega: 1 “Documento de Governança” (5 partes)



No fim: pitch de 3 minutos por dupla



Este documento cresce nas próximas 6 noites → vira o projeto



A regra de hoje

Ainda **não** é hora de escopo, tarefas ou telas.

Hoje vocês definem apenas
como o projeto será decidido e conduzido — a estrutura que segura tudo o que vem depois.



VISÃO GERAL

0 caminho de hoje, em 7 passos

Sigam na ordem. Cada passo é rápido e tem um exemplo. Os passos 2 a 6 geram os documentos que vocês vão entregar.



Passos 2 → 6 = seus 5 documentos. Ao terminar o passo 6, seu “Documento de Governança” está pronto. O passo 7 é apresentá-lo.



O ENTREGÁVEL

Exatamente o que a dupla entrega

Ao final da aula, cada dupla entrega **UM documento** — o “Documento de Governança do Projeto” (1 a 2 páginas) — formado por estas 5 partes:

1

Termo de Abertura

Nome, problema, objetivo, valor esperado, patrocinador, restrições, premissas e o GP.

2

Matriz RACI

Quem faz e quem responde por 4 decisões-chave do projeto.

3

Modelo + Autoridade e Escalonamento

O modelo escolhido, o que a dupla decide x o que sobe ao patrocinador, e a cadência.

4

Painel de Métricas

3 métricas de resultado (valor) + 1 sinal de alerta (indicador antecedente).

5

Regras do Jogo + Registro de Decisões

3 a 5 acordos de trabalho e um log: data · decisão · responsável.



+ PITCH

2 min por dupla

*apresentando a
governança*



PASSO 1 DE 6

Pense no PROJETO (a ideia)

O QUE FAZER

Antes de tudo: o que vocês vão fazer? Só a ideia — ainda NÃO as funcionalidades.

- Escolham um projeto de software que resolva um problema real de vocês.
- **Descrevam em 1 frase, com este molde:**
- “Vamos criar [o quê] para [quem] resolver [qual problema].”
- **Ideia ≠ escopo: hoje é o QUÊ e o PORQUÊ — não o COMO nem a lista de telas.**

EXEMPLO · App de Carona SETREM

Molde: “Vamos criar [o quê] para [quem] resolver [qual problema].”

Projeto: App de carona que conecta alunos da SETREM no mesmo trajeto, para dividir o transporte.

Problema: Alunos gastam muito para ir ao campus e há vagas ociosas em carros.

Ainda NÃO definido: telas, funcionalidades, tecnologia, tarefas (isso é escopo → 20/08).



Dica: escolham algo que realmente entendam e se importem — vão conviver com esse projeto por 7 noites.



Preencham o Termo de Abertura

O QUE FAZER

É o documento que “dá a largada”. Preencham estes 8 campos — curtos, 1 linha cada:

- Nome do projeto
- Problema / oportunidade — o porquê
- Objetivo — o que se quer alcançar (1 frase)
- Valor esperado — por que vale a pena
- Patrocinador — quem “quer” o projeto (pode inventar)
- Restrições — prazo, orçamento, LGPD...
- Premissas — o que assumimos como verdade
- Gerente do projeto — quem, da dupla, lidera

EXEMPLO · App de Carona SETREM

Nome: Carona SETREM

Problema: Custo alto de transporte + carros com vagas ociosas

Objetivo: Lançar um app de caronas entre alunos até o fim do semestre

Valor: Economia para o aluno e menos carros no campus

Patrocinador: Coordenação do curso (definido pela dupla)

Restrições: Prazo do semestre · orçamento zero · LGPD (localização)

Premissas: Alunos têm smartphone e querem dividir caronas

GP: Aluno(a) 1



Definam papéis e a Matriz RACI

O QUE FAZER

- Distribuem os papéis (na dupla + um patrocinador).
- Montem uma RACI para 4 decisões-chave.
- **Regra de ouro: só 1 "A" (quem responde) por decisão.**

PAPÉIS · Carona SETREM

GP (Aluno 1): conduz o projeto e responde pelas entregas
PO/Analista (Aluno 2): prioriza e representa o valor
Patrocinador: Coordenação (externo, definido pela dupla)

Decisão-chave	Patroc.	GP	PO
Aprovar a ideia / termo de abertura	A	R	C
Aprovar mudança grande	A	R	C
Priorizar o que fazer primeiro	C	C	A
Homologar a entrega	A	R	C



Modelo, autoridade e escalonamento

O QUE FAZER

Definam *COMO* e por *QUEM* as decisões são tomadas. Respondam a 4 perguntas:

- **Qual modelo?** Estruturada, híbrida ou autogovernança.
- O que a dupla decide sozinha?
- O que precisa subir ao patrocinador?
- Como escalonam quando não há consenso?
- Com que frequência vão se reunir para decidir? (cadência)

EXEMPLO · App de Carona SETREM

Modelo: Híbrido — leve, com patrocinador aprovando marcos

Dupla decide: Ferramentas, divisão de tarefas e decisões técnicas

Sobe ao patrocinador: Mudança de objetivo, prazo ou “cara” do produto

Escalonamento: Sem consenso na dupla → decide o GP; afeta o objetivo → patrocinador

Cadência: Check-in de 10 min no início de cada aula



Para projeto de dupla, o modelo costuma ser híbrido/leve — mas registrem a escolha e o porquê.



Métricas de resultado + 1 sinal

O QUE FAZER

Como vocês vão saber que o projeto entregou VALOR? Escolham:

- **3 métricas de RESULTADO** — medem valor entregue, não esforço.
- **1 sinal de alerta** (indicador antecedente) — avisa cedo se algo vai mal.
- Fuja de “horas trabalhadas” e “telas prontas”. Isso é esforço, não resultado.
- Prefira: uso real, adoção, satisfação, economia gerada.

EXEMPLO · App de Carona SETREM

Resultado 1: Nº de caronas efetivadas por semana

Resultado 2: % de alunos que usariam o app (pesquisa)

Resultado 3: Custo médio de transporte economizado por aluno

Sinal de alerta: Cadastros na 1ª semana < 30 → acender alerta

NÃO usar: Nº de horas de código, nº de telas feitas (é esforço)



Regras do jogo + registro de decisões

O QUE FAZER

Fechem com os acordos do time e comecem a registrar as decisões — já as de hoje!

- **Escrevam 3 a 5 regras/acordos de trabalho (guardrails).**
- Definam o que significa “pronto” (Definition of Done).
- **Abram um registro de decisões: data · decisão · responsável.**
- Anotem AGORA as decisões que já tomaram nos passos 1 a 5.

EXEMPLO · App de Carona SETREM

Regra 1: Toda mudança grande vai ao patrocinador

Regra 2: Decisão importante entra no registro

Regra 3: “Pronto” = testado e aceito pelo PO

Regra 4: Sem consenso na dupla → decide o GP

Registro (log): 13/08 · modelo híbrido escolhido · GP · 13/08 · foco campus ↔ centro · PO



0 Pitch: 3 minutos por dupla

Não é para vender funcionalidades — é para mostrar como o projeto será GOVERNADO. Respondam a 4 perguntas:



1. Qual é o projeto?

A ideia em 1 frase (o quê + para quem + porquê).



2. Quem decide o quê?

Patrocinador, GP e PO — e as decisões-chave (RACI).



3. Como medem sucesso?

As 3 métricas de resultado + o sinal de alerta.



4. Quais as regras do jogo?

O modelo, o escalonamento e os principais acordos.



Pronto quando: as 5 partes do documento estão preenchidas e a dupla consegue responder às 4 perguntas acima em 2 minutos.
