

GESTÃO DE PROJETOS · GUIA PMBOK® · 8ª EDIÇÃO (2025/2026)

Escopo


O Domínio de Desempenho de Escopo

A ponte entre o que os stakeholders precisam e o valor que o projeto entrega.

Prof. Eduardo Mildner

Engenharia da Computação · SETREM

20/08/26

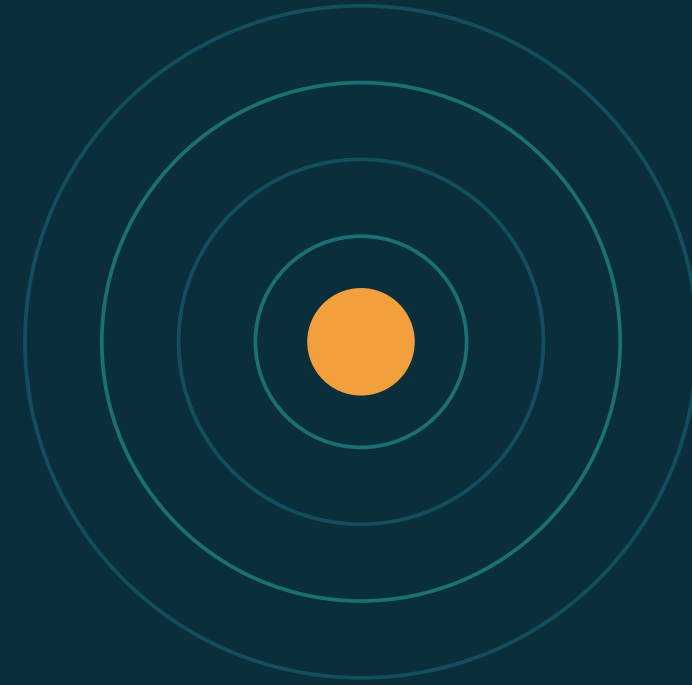

Data	Escopo
06/08/26	Introdução a Gestão de Projetos
13/08/26	Governança
20/08/26	Escopo
27/08/26	Cronograma
03/09/26	Finanças
10/09/26	Partes Interessadas
17/09/26	Recursos
24/09/26	Riscos
01/10/26	Trabalho Prático 01
08/10/26	SCRUM
15/10/26	KANBAN
22/10/26	Trabalho Prático 02
29/10/26	Trabalho Prático 02 Apresentação
05/11/26	XP
12/11/26	Palestra
19/11/26	PRINCE2
26/11/26	FDD e DSDM
03/12/26	Prova
10/12/26	O Futuro da Gestão de Projetos
17/12/26	Prova Substitutiva

O que vamos percorrer

01

Fundamentos

A evolução do PMBOK e o que muda na 8ª edição



02

As três dimensões

Escopo do projeto, do produto e a qualidade



03

O Domínio e seus 6 processos

Do planejamento à validação do escopo



04

Estruturas do escopo

EAP, Backlog do Produto e a nova VBS



05

Linha de base & DoD

Compromisso, controle de mudanças e "Pronto"



06

Práticas, métricas e armadilhas

Scope creep, tailoring e melhores práticas



A evolução do Guia PMBOK®



6ª ed. · 2017

Baseada em processos

10 áreas de conhecimento · 49 processos prescritivos · 5 grupos de processos



7ª ed. · 2021

Baseada em princípios

12 princípios · 8 domínios de desempenho · os processos foram removidos



8ª ed. · 2025/26

Abordagem híbrida

6 princípios · 7 domínios · 5 focus areas · 40 processos não prescritivos



CURIOSIDADE

A 8ª edição é a mais orientada por dados da história do guia: foi construída a partir de mais de 48.000 pontos de dados e da contribuição de milhares de profissionais.

ONDE O ESCOPO SE ENCAIXA

Os 7 Domínios de Desempenho

Os domínios substituem as 10 áreas de conhecimento da 6ª edição e os 8 domínios da 7ª. O Escopo é onde reside o valor central do projeto.



Governança



Escopo

nosso foco



Cronograma



Finanças



Stakeholders



Recursos



Riscos

O que é escopo para vocês?

Afinal, o que é escopo?



Escopo não é uma lista de tarefas.

É a ponte entre o que os stakeholders precisam e o valor que o projeto deve gerar a fronteira do que está, e do que não está, incluído.

No PMBOK® 8, o Domínio de Escopo garante que os entregáveis e os requisitos sejam definidos, validados e controlados ao longo de todo o ciclo de vida.



Todo o trabalho necessário

...e apenas o necessário. Nada de trabalho supérfluo.



Orientado a valor

A entrega existe para gerar um resultado com valor.



Definido, validado e controlado

Fronteiras claras, aceite formal e mudanças sob controle.

Escopo são três coisas ao mesmo tempo

Quando dizemos "escopo", quase sempre pensamos em uma coisa só. O PMBOK® 8 mostra que ao menos três coisas acontecem juntas — e comprimi-las em um único item é onde a armadilha começa.



Escopo do Projeto

Todo o trabalho realizado para entregar o produto, serviço ou resultado. É o componente mais importante da linha de base nele reside o valor esperado.



Escopo do Produto

A descrição clara das características, funções e atributos do resultado. Define exatamente o que a entrega deve ser e fazer.



Qualidade

Atributo integrante do escopo. Foca em atender às expectativas dos stakeholders e cumprir os requisitos do projeto e do produto.



INSIGHT DE CAMPO

Se uma ponte cai em quatro anos, ninguém vai defender o trabalho dizendo que "integridade estrutural estava fora do escopo". A maioria das falhas de escopo não vem de fazer o trabalho errado vem de pessoas inteligentes concordando com palavras que significavam coisas diferentes.

Escopo do Produto × Escopo do Projeto



Escopo do Produto

"O QUÊ" — o resultado

FOCO Características, funções e atributos

PERGUNTA O que a entrega deve ser e fazer?

MEDIDO POR Requisitos do produto atendidos

MUDA QUANDO A definição do resultado muda



Escopo do Projeto

"COMO" — o trabalho

FOCO Todo o trabalho para entregar o produto

PERGUNTA Que trabalho é necessário (e só ele)?

MEDIDO POR Conformidade com o plano de escopo

MUDA QUANDO O trabalho para entregar muda

Exemplo: app de matrícula acadêmica



Projeto: desenvolver um aplicativo para os alunos realizarem matrícula online em disciplinas.



Escopo do PRODUTO

- Login integrado ao sistema acadêmico
- Tela com grade de horários sem conflito
- Confirmação de matrícula por e-mail
- Funciona em Android e iOS



Escopo do PROJETO

- Levantar requisitos com a secretaria
- Programar back-end, front-end e testes
- Homologar com uma turma-piloto
- Treinar usuários e publicar nas lojas



FORA DO ESCOPO (EXCLUSÕES)

Deixar explícito o que NÃO entra ex.: pagamento de mensalidades ou app para professores — evita expectativas equivocadas tanto quanto listar o que entra.

O Domínio de Escopo em ação

O domínio segue um padrão Planejar → Executar → Monitorar. Ele garante que a fronteira do projeto permaneça clara e alinhada ao valor do começo ao fim.



Planejar

Definir a abordagem e detalhar requisitos e entregáveis



Executar

Estruturar o trabalho e produzir os entregáveis



Monitorar

Controlar mudanças, medir qualidade e validar o aceite



O que o domínio assegura

- Escopo claro: fronteiras, exclusões e critérios de aceite sem ambiguidade
- Expansão controlada: o scope creep é identificado antes de comprometer o projeto
- Requisitos estáveis: evoluem de forma gerenciada, não caótica
- Sustentabilidade no escopo: impactos sociais, ambientais e de longo prazo entram na definição

Os 6 processos do escopo

Eles seguem uma sequência lógica — do planejamento ao aceite formal. Cinco costumam ser executados bem; um é sistematicamente apressado (o de requisitos).

1



Planejar o Gerenciamento do Escopo

2



Levantar e Analisar Requisitos

3



Definir o Escopo

4



Desenvolver a Estrutura do Escopo

5



Monitorar e Controlar o Escopo

6



Validar o Escopo

1

DOMÍNIO DE ESCOPO • PROCESSO 1 DE 6

Planejar o Gerenciamento do Escopo

Plan Scope Management

Cria o plano que documenta exatamente COMO o escopo será definido, validado e controlado. É a primeira saída do domínio e serve de guia para todos os processos seguintes.



EM ESSÊNCIA

- Abordagem de definição do escopo e formato da documentação
- Como a EAP será desenvolvida nível de decomposição e responsáveis
- Como os entregáveis serão inspecionados e formalmente aceitos
- Como as solicitações de mudança de escopo serão tratadas



MELHOR PRÁTICA

Torne o processo de aceite inegociável: cada entregável relevante exige um aceite assinado. Aprovações verbais dadas na correria costumam ser revertidas no aceite formal gerando retrabalho caro.

2

DOMÍNIO DE ESCOPO • PROCESSO 2 DE 6

Levantar e Analisar Requisitos

Elicit and Analyze Requirements

Determinar, documentar e gerenciar as necessidades dos stakeholders para atender aos objetivos. Vai muito além de "coletar": elicitar é chegar à verdade inclusive registrando divergências de forma explícita.



EM ESSÊNCIA

- Coleta de dados: entrevistas, grupos focais, benchmarking
- Habilidades interpessoais: técnica de grupo nominal, design thinking
- Requisitos capturados com detalhe suficiente para serem medidos
- Base para a EAP e para todo o trabalho seguinte



MELHOR PRÁTICA

Requisitos bem levantados são a fundação de tudo. Documente-os de forma rastreável (da origem até o teste) para conseguir medir se estão realmente sendo atendidos na execução.

O processo que todo mundo apressa

5 de 6

processos costumam ser executados adequadamente pelas equipes.



O que é rotineiramente pulado, apressado ou tratado como formalidade chata é justamente o levantamento de requisitos e não por falta de compreensão do seu valor.

Elicitar requisitos de verdade é desconfortável: significa sentar com os stakeholders até que digam algo que nem sabiam que pensavam, e documentar desacordos de forma explícita.



POR QUE ISSO IMPORTA

Requisitos mal levantados são a causa oculta por trás da maioria das falhas de escopo mais do que qualquer erro técnico posterior.

3

DOMÍNIO DE ESCOPO • PROCESSO 3 DE 6

Definir o Escopo

Define Scope

Desenvolve a descrição do projeto, do produto e do VALOR esperado. Uma vez que os requisitos estão documentados com honestidade, este processo constrói a descrição real do trabalho.



EM ESSÊNCIA

- Descreve projeto, produto e valor a ser entregue
- Identifica os requisitos de qualidade dos entregáveis
- Estabelece como demonstrar conformidade com eles
- Gera a declaração de escopo — referência de todo o resto



BOA PRÁTICA

Ancore a definição na Definição de Pronto (DoD): o conjunto de critérios que um entregável precisa cumprir para ser considerado apto ao uso pelo cliente. Ela sustenta todos os processos do domínio.

4

DOMÍNIO DE ESCOPO • PROCESSO 4 DE 6

Desenvolver a Estrutura do Escopo

Develop Scope Structure

Subdivide os entregáveis do projeto em componentes menores e gerenciáveis. É aqui que o acordo sobre o escopo se torna completamente visível para todos os stakeholders.



EM ESSÊNCIA

- Em ambientes preditivos/híbridos: materializa-se na EAP (WBS)
- Em ambientes ágeis: corresponde ao backlog do produto
- Quebra o trabalho em pacotes fáceis de atribuir e medir
- Introduz também a VBS, que conecta escopo e valor




REFRAME

Pare de tratar suas estruturas como burocracia. Uma EAP bem construída faz o que nenhuma reunião semanal de status consegue: torna o acordo visível e mensurável.

A EAP (Work Breakdown Structure)

Decomposição hierárquica do trabalho total em pacotes menores, atribuíveis e mensuráveis — garantindo entendimento compartilhado dos entregáveis.

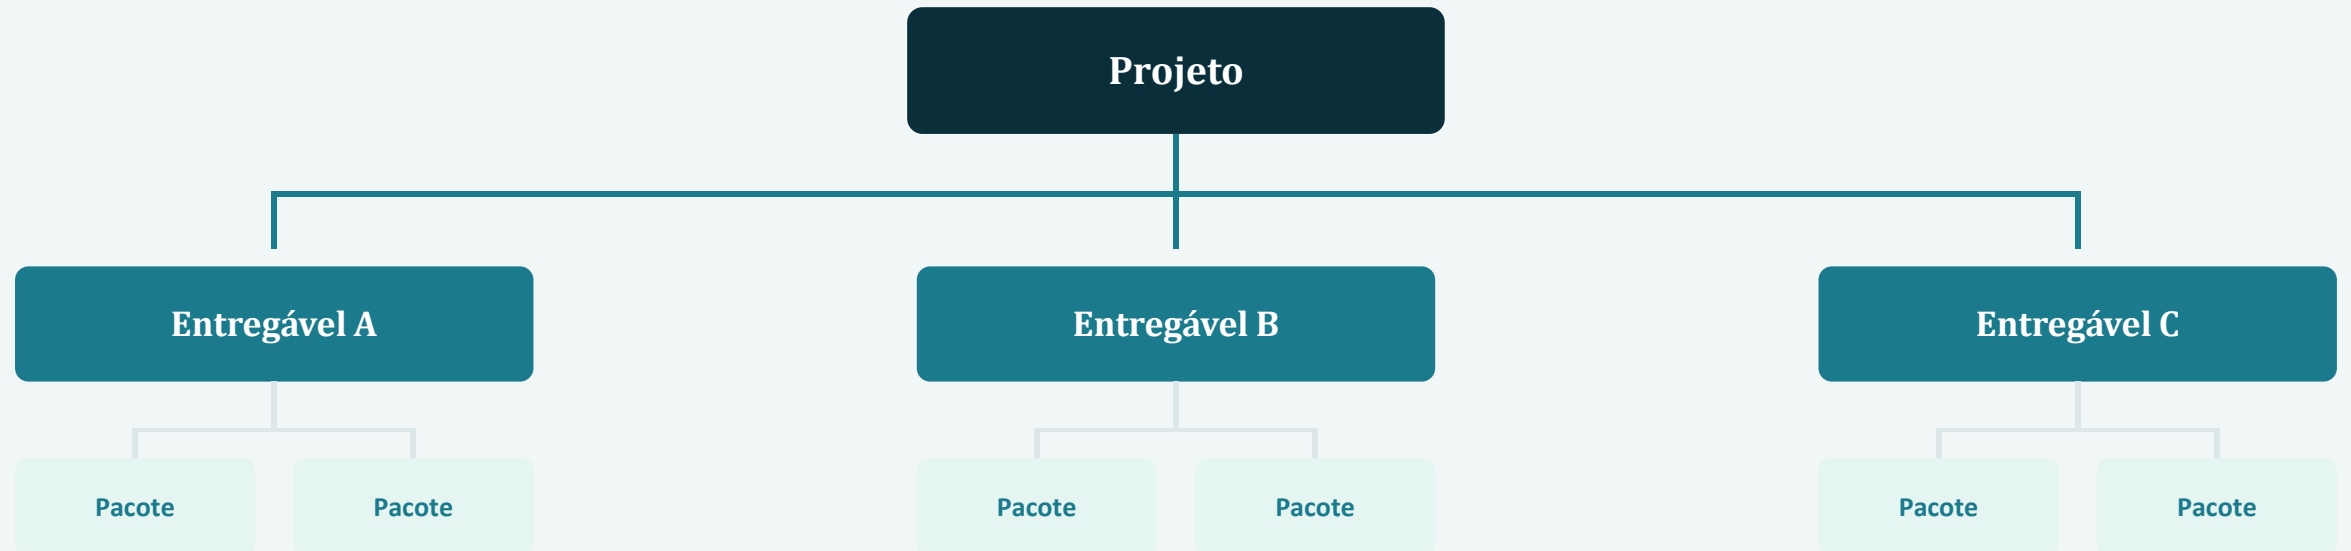

DICIONÁRIO DA EAP

Para entregáveis complexos, apoie a EAP com o dicionário da EAP: descrições de escopo, marcos, responsáveis, recursos necessários e critérios de aceite específicos de cada pacote.

EAP × Backlog do Produto

A mesma necessidade — tornar o escopo visível e gerenciável — assume duas formas conforme a abordagem de desenvolvimento.



EAP (Preditivo/Híbrido)

- Decomposição hierárquica do trabalho total
- Estrutura estável, mudanças sob controle formal
- Pacotes de trabalho atribuíveis e mensuráveis
- Apoiada pelo dicionário da EAP



Backlog do Produto (Ágil)

- Lista dinâmica e priorizada de itens de trabalho
- Repriorização contínua orientada a valor
- Decomposto em épicos, features e histórias
- Foco em resultados de valor, não em tarefas fixas



CURIOSIDADE

No ágil, os itens do backlog descem em três níveis de granularidade épicos → features → histórias de usuário permitindo detalhar o escopo só quando ele está prestes a ser trabalhado.

Value Breakdown Structure (VBS)

Estrutura hierárquica que conecta diretamente o escopo do projeto e seu valor pretendido ao escopo do produto tornando a prioridade estratégica visível a todos.

- No topo: os principais entregáveis gerados
- Cada um recebe o valor esperado — em R\$ ou em %
- Itens obrigatórios entram como 100%
- Permite priorizar e calcular o custo de atraso de cada item crítico



REFRAME ESTRATÉGICO

O entregável mais difícil nem sempre é o mais valioso. A VBS torna essa prioridade visível para absolutamente todos.

EXEMPLO — VALOR POR ENTREGÁVEL

Módulo de matrícula

60%

Relatórios de gestão

25%

Painel do aluno

15%

Conformidade (LGPD)

100% (obrig.)

5

DOMÍNIO DE ESCOPO • PROCESSO 5 DE 6

Monitorar e Controlar o Escopo

Monitor and Control Scope

Acompanha o status do escopo, gerencia mudanças na linha de base e mede a qualidade para garantir o cumprimento dos padrões. É o processo que mantém o projeto no rumo combinado.



EM ESSÊNCIA

- Monitora continuamente o status do escopo
- Gerencia mudanças na linha de base do escopo
- Mede qualidade para assegurar os padrões
- Aciona controle de mudanças quando necessário



ATENÇÃO

Uma mudança de escopo nunca é só escopo: ela derruba cronograma, finanças e risco como peças de dominó. Por isso passa por processos de revisão e aprovação da governança.

6

DOMÍNIO DE ESCOPO • PROCESSO 6 DE 6

Validar o Escopo

Validate Scope

Verifica os processos usados para atingir os padrões de qualidade e formaliza o ACEITE dos entregáveis concluídos. É a conversa que transforma "entregue" em "aceito".

VALIDAR × CONTROLAR



Validar o Escopo

Aceite formal, com o cliente — o entregável é aprovado.



Controlar o Escopo

Manutenção da conformidade — interno, contra a linha de base.

*Um valida o **RESULTADO**; o outro cuida do **PROCESSO**.*



MELHOR PRÁTICA

Acompanhe indicadores simples de escopo ao longo do caminho. Equipes que medem regularmente não são surpreendidas na reunião de entrega final.

A Linha de Base do Escopo



A linha de base não é o documento. É o compromisso que o documento representa se um lado quer mudar, precisa dizer em voz alta e obter aprovação mútua.



Ambiente Preditivo

- Versão formal e aprovada dos documentos de escopo
- Junto do cronograma e do custo, forma a linha de base de medição de desempenho
- Alterada apenas por controle formal de mudanças



Ambiente Adaptativo

- Redefinida no início de cada iteração
- Alinhada aos requisitos priorizados por valor
- O Product Owner aprova mudanças dinamicamente, sem controle formal



O QUE QUEBRA PROJETOS

Tratar a linha de base como mera formalidade: escrever o documento, salvar numa pasta, nunca mais olhar e gerenciar o dia a dia de memória. Receita para o desastre.

Definição de Pronto (DoD)

A DoD é a lista de todos os critérios que precisam ser cumpridos para que um entregável seja considerado apto ao uso pelo cliente. Em abordagens adaptativas, é o entendimento compartilhado do que torna uma história ou feature realmente concluída.

EXEMPLO DE DoD

- ☒ Código revisado por outro dev
- ☒ Testes automatizados passando
- ☒ Documentação atualizada
- ☒ Aprovado pelo Product Owner



POR QUE A DOD É PODEROSA

Ela evita a conversa terrível em que a equipe diz que o trabalho está pronto e o cliente pagante diz firmemente que não está. Definir o "Pronto" ANTES de começar alinha expectativas e blinda o aceite. Combine-a com critérios de aceite claros por entregável.

O INIMIGO SILENCIOSO

Scope Creep

O crescimento não controlado do escopo funcionalidades e entregáveis que vão sendo adicionados sem ajuste correspondente de tempo, custo ou recursos.

CAUSAS COMUNS



Requisitos vagos

Fronteiras mal definidas desde o início



Sem controle de mudanças

Alterações entram "por fora" do processo



"Só mais essa featurezinha"

Pequenos acréscimos que se acumulam



COMO PREVENIR

Linha de base de escopo clara + controle de mudanças disciplinado + Definição de Pronto + requisitos rastreáveis. O scope creep se combate tornando toda mudança visível e deliberada nunca silenciosa.

Tailoring do gerenciamento de escopo

Nem todo projeto deve gerenciar escopo do mesmo jeito. As atividades precisam ser adaptadas às restrições específicas de cada contexto.



Ambientes dinâmicos

Volatilidade de mercado exige flexibilidade e mecanismos de feedback iterativo para ajustar o escopo em tempo real.



Setores de design intensivo

Farmacêutica, construção: invista muito esforço na definição inicial para evitar mudanças caras nas fases finais.



Com parceiros externos

Harmonize as obrigações contratuais para sincronizar todos os compromissos relacionados ao escopo.



Projetos híbridos

Baselines rígidas no todo convivendo com subtimes iterando histórias no backlog — a tensão que exige mais tailoring.

O efeito dominó das mudanças de escopo

O escopo não existe isolado. Uma mudança de escopo nunca é só uma mudança de escopo — é o dominó que derruba tudo o mais.



Indicadores de escopo

Gerenciar escopo não é intuição. Estes indicadores funcionam como sinais de alerta antecipados sobre a saúde do projeto.



%

Precisão da Definição

$\text{Itens entregues corretamente} \div \text{Itens planejados} \times 100$

↑ *maior é melhor*



%

Scope Creep

$\text{Entregas não planejadas} \div \text{Total de entregas} \times 100$

↓ *menor é melhor*



%

Estabilidade de Requisitos

$\text{Requisitos não alterados} \div \text{Total de requisitos} \times 100$

↑ *maior é melhor*



MELHOR PRÁTICA

Acompanhe estes indicadores de forma regular e leve. Times que medem cedo enxergam a rota de colisão a tempo — e não descobrem o problema só na entrega final.

Melhores práticas de escopo



Separe as três dimensões

Trate projeto, produto e qualidade explicitamente — nunca num único bullet.



Invista nos requisitos

Dedique tempo real ao levantamento; registre até os desacordos.



Baseline viva

Compromisso a ser revisitado, não papel arquivado numa pasta.



Defina o "Pronto"

Estabeleça a DoD e os critérios de aceite ANTES de começar.



Torne o valor visível

Use a VBS e priorize pelo que realmente move o ponteiro.



Mudança sob governança

Todo ajuste passa por controle; reescopar é decisão legítima.

Armadilhas mais comuns



Comprimir projeto + produto + qualidade num único item construindo uma armadilha para si mesmo



Pular ou apressar o levantamento de requisitos por ser desconfortável



Tratar a EAP como burocracia de "marcar caixinha", sem torná-la um acordo visível



Salvar a linha de base e nunca mais olhar gerenciando o dia a dia de memória



Aceitar "só mais essa featurezinha" sem passar por controle de mudanças



Confundir Validar (aceite do resultado) com Controlar (conformidade do processo)

Um projeto, sete conversas simultâneas

E o Escopo é onde reside o valor central do projeto.



Escopo são três coisas

Projeto, produto e qualidade tratadas separadamente.



Requisitos primeiro

A etapa mais apressada é a que mais custa lá na frente.



Estruture pelo valor

EAP, backlog e VBS tornam o acordo e o valor visíveis.



Baseline é compromisso

Mudanças passam por governança; reescopar é legítimo.

Obrigado! Perguntas e discussão.

Prof. Eduardo Mildner · Gestão de Projetos · Engenharia da Computação — SETREM
