

Partes Interessadas

Domínio de Desempenho das Partes Interessadas

Prof. Eduardo Mildner

Material de aula · conteúdo alinhado ao PMBOK® Guide 8ª edição



O que vamos estudar



Onde estamos no PMBOK 8

A estrutura da 8ª edição e o lugar deste domínio

01



Conceitos fundamentais

Definição, a "paisagem" e por que o domínio importa

02



Patrocinador e 5 conceitos-chave

O papel ativo do sponsor e as ideias centrais

03



Os 7 processos do domínio

Do identificar ao monitorar, ao longo do ciclo

04



Ferramentas e artefatos

Matrizes de análise, engajamento e documentos

05



Adaptação, IA e atividade

Tailoring, inteligência artificial e prática nas duplas

06

Onde estamos: a arquitetura do PMBOK 8

A 8ª edição (digital em nov/2025, impressa em jan/2026) combina a flexibilidade baseada em princípios da 7ª edição com a estrutura prática das edições anteriores. As Partes Interessadas são um dos sete domínios de desempenho.

6

Princípios

7

Domínios de
desempenho

5

Áreas de foco

40

Processos
(com ITTOs)

109

Ferramentas e
técnicas

OS SETE DOMÍNIOS DE DESEMPENHO

Governança

Escopo

Cronograma

Finanças

Partes Interessadas

Recursos

Riscos



As 5 áreas de foco retomam os antigos grupos de processos

Iniciação · Planejamento · Execução · Monitoramento e Controle · Encerramento — de forma não prescritiva e adaptável a abordagens preditivas, ágeis e híbridas.

O que mudou: da 6ª à 8ª edição

6ª ed. (2017)

Baseada em processos

- 49 processos
- 10 áreas de conhecimento
- 5 grupos de processos
- Forte guia "passo a passo"

7ª ed. (2021)

Baseada em princípios

- 12 princípios
- 8 domínios de desempenho
- Processos removidos
- Foco em valor e adaptação

8ª ed. (2025)

O melhor dos dois mundos

- 6 princípios · 7 domínios
- 40 processos retornam (ITTOs)
- 5 áreas de foco
- Valor, IA e sustentabilidade



Mudança de terminologia

Não falamos mais em "gerenciamento das partes interessadas". O termo atual é ENGAJAMENTO das partes interessadas uma disciplina contínua e viva, não uma fase que se conclui.

O que são partes interessadas?



Definição (PMBOK® 8ª ed.)

Indivíduos, grupos ou organizações internos ou externos que podem afetar, ser afetados por, ou que percebem que podem ser afetados por uma decisão, atividade ou resultado do projeto.



Percepção é realidade

Basta a pessoa sentir que pode ser impactada para se tornar relevante. Ela não precisa estar formalmente envolvida nem estar certa.

De poucas a milhões

Um projeto pode ter um punhado de partes interessadas ou milhões delas.

Poder, interesse e influência

Não são fixos: mudam conforme o projeto avança de fase.

Neutro hoje, crítico amanhã

Um apoiador passivo pode virar seu maior defensor ou opositor.

Não é uma lista é uma paisagem



A analogia da cidade

Do chão, você só vê ruas, prédios e pessoas se movendo. Do avião, você vê os padrões: os agrupamentos, os fluxos e as lacunas.

A maioria dos gerentes trabalha "do chão". Precisamos aprender a enxergar a paisagem de cima.

"Um mapa desenhado no mês 1 não reflete o terreno do mês 6."



A paisagem é dinâmica

Poder, influência e interesse de qualquer parte podem — e vão — mudar a cada fase.



Identificação é contínua

Novas partes surgem quando as condições mudam. Não identificá-las cria surpresas dolorosas.



Identificar é gerir risco

A identificação contínua funciona como uma estratégia de gerenciamento de riscos do projeto.

Por que este domínio é decisivo

É tentador tratar as partes interessadas como função de apoio que corre "ao lado" do trabalho de verdade. Esse enquadramento está de cabeça para baixo.



Definem requisitos

São a origem do que o projeto precisa entregar.



Moldam o planejamento

Influenciam decisões de escopo, prazo e prioridade.



Determinam o aceite

Estabelecem os critérios pelos quais o resultado é aprovado.



Influenciam o risco

Algumas reduzem incertezas; outras as aumentam.



“As partes interessadas não estão ao redor do projeto elas estão entrelaçadas por todo ele.”

Resultado esperado do domínio:

relacionamentos produtivos, engajamento mantido ao longo do tempo e alinhamento das partes com os objetivos e o valor do projeto.

Tipos de partes interessadas



Internas

Dentro da organização

- Patrocinador (sponsor)
- Equipe do projeto
- Gerência e executivos
- PMO e áreas funcionais



Externas

Fora da organização

- Clientes e usuários finais
- Fornecedores e parceiros
- Órgãos reguladores
- Comunidade e sociedade



Exemplo: projeto de app acadêmico (Engenharia da Computação)

Usuários

estudantes que usarão o app

Orientador

professor que avalia o projeto

TI da instituição

infraestrutura e integração

Fornecedor de nuvem/API

serviços externos (ex.: hospedagem)

O patrocinador: a parte interessada mais importante

Todo projeto tem um patrocinador no papel.

Mas nem todo projeto tem um patrocinador ativo na prática.



A pesquisa é direta:

um patrocinador ativo é um fator crítico de sucesso para alcançar resultados positivos nos projetos. Não basta ser apoiador ou disposto precisa ser ativo.



Um patrocinador que não se engaja não é um recurso é um enorme risco do projeto.

Quando o sponsor faz parte da liderança executiva, a relação exige esforço deliberado: estilo, nível de detalhe e cadência calibrados a como ele recebe informação e decide.

O papel ativo do patrocinador

Não é um papel cerimonial é um parceiro de trabalho. Um patrocinador ativo:



Inicia o projeto

Dá partida e define o business case (justificativa de negócio).



Aprova o termo de abertura

Autoriza o project charter e as mudanças relevantes.



Empodera o gerente

Designa e dá autoridade ao gerente de projeto.



Preside o comitê diretivo

Participa e conduz o steering committee.



Aprova o plano

Valida o plano de gerenciamento do projeto.



Garante os benefícios

Zela pela realização dos benefícios de longo prazo.



E ainda...

propõe o término do projeto quando necessário e autoriza o encerramento formal quando concluído.



Dica

No seu projeto, identifique quem é o "dono" da ideia e trate-o como sponsor ativo.

Os cinco conceitos que sustentam o domínio

Entenda-os como um sistema interconectado: cada conceito apoia fortemente os demais.



1

Satisfação é objetivo

Priorizada e integrada desde o início — não um bônus pós-entrega.



2

A equipe é stakeholder


O trabalho e as melhores decisões técnicas vêm dela.



3

Comunicação sob medida

Informação certa, no formato certo, no momento certo.



4

Decisão orientada a dados

IA apoia coletar, analisar e apresentar recomendações.



5

Fornecedores contam

Parceiros externos são partes interessadas ativas.

Satisfação como objetivo do projeto

A satisfação das partes interessadas não é um bônus que chega depois da entrega ela deve ser priorizada e integrada aos objetivos centrais desde o começo.

- Exige comunicação contínua com clientes, usuários, gestores, executivos e a equipe.
- Entenda necessidades, trate problemas assim que surgem e gerencie interesses conflitantes.
- Fomente o envolvimento das partes nas decisões do projeto.
- Se a satisfação é tratada como saída da entrega (e não como entrada), você descobre os problemas tarde demais.



Exemplo prático

Num app acadêmico, valide protótipos com usuários reais a cada iteração não deixe o feedback só para o final.

A equipe é uma parte interessada

Este é o conceito que mais se esquece. Os membros da equipe são partes interessadas críticas e devem ser tratados como tais.

- O trabalho de fato vem deles assim como as melhores recomendações em decisões técnicas difíceis.
- O engajamento e a segurança psicológica da equipe moldam cada resultado do projeto.
- Um gerente que administra bem "para cima" mas negligencia a equipe gerencia apenas metade da paisagem.



Dica

Nas duplas, tratem-se mutuamente como stakeholders: combinem cadência de trabalho, papéis e um canal para levantar bloqueios cedo.

As comunicações devem ser personalizadas

Não se padroniza conexão humana. A forma de comunicar precisa ser adaptada ao que serve às necessidades específicas de cada parte interessada.

- As pessoas precisam da informação certa, no formato certo, no momento certo para decidir com confiança.
- Um executivo pode querer só um resumo de uma página.
- Um usuário final pode precisar estar fisicamente na sala.
- Um fornecedor pode exigir um ciclo de atualização semanal e estruturado.




Regra de ouro

O plano de comunicações existe para tornar essas escolhas deliberadas e não acidentais.

Tomada de decisão orientada a dados

Um dos conceitos mais atuais do PMBOK 8 é o reconhecimento explícito da inteligência artificial no apoio às decisões.

- Ferramentas de IA ajudam a coletar, analisar e interpretar dados para apoiar decisões sobre as partes interessadas.
- Análise preditiva e visualização de dados fortalecem a apresentação de recomendações.
- Isso dá mais confiança e velocidade às partes interessadas.
- Não se trata de substituir o julgamento humano, mas de argumentar na linguagem que stakeholders orientados a dados conseguem acionar.



Contexto Eng. Computação

Vocês têm vantagem aqui: dá para prototipar dashboards ou análises simples de sentimento para embasar decisões do projeto.

Fornecedores também são partes interessadas

Aquisições podem não ser o núcleo deste domínio, mas a gestão de fornecedores é listada como conceito-chave por um bom motivo.

- Em setores como construção e TI, as relações com fornecedores são absolutamente centrais para o sucesso.
- Parceiros externos têm suas próprias restrições, interesses e necessidades de comunicação.
- Tratá-los como fornecedores passivos em vez de partes interessadas ativas é um ponto cego que sempre aparece na execução.



Exemplo prático

Se o projeto usa uma API paga ou serviço de nuvem, mapeie limites de uso, custos e SLA como restrições reais do projeto.

Os 7 processos ao longo do ciclo de vida

O domínio reúne sete processos que atravessam TODO o ciclo de vida. Não é algo que se ativa uma vez e se arquiva nem uma sequência rígida.



Fluxo contínuo — identificação e engajamento são revisitados a cada mudança do projeto

Identificar as partes interessadas

1

O QUE É

- Identifica, analisa e documenta interesses, envolvimento, interdependências e influência das partes.
- É a fundação de todo o domínio.
- Lembre-se: a identificação contínua funciona como uma estratégia de gerenciamento de riscos.
- Quando as condições mudam, novas partes surgem se não forem identificadas, viram surpresas dolorosas.



Benefício-chave

Permite à equipe direcionar o engajamento de forma apropriada.



Saída principal

O Registro das Partes Interessadas — a lista viva com quem são, seus interesses e sua influência.

Planejar o engajamento

2

O QUE É

- Desenvolve estratégias para engajar as pessoas com base em suas necessidades, expectativas e impacto potencial.
- Partes diferentes exigem abordagens diferentes e níveis de envolvimento distintos.
- A saída é um plano acionável não um calendário genérico de comunicação.



Benefício-chave

Aumenta o apoio e reduz a resistência ao longo do projeto.



Saída principal

O Plano de Engajamento das Partes Interessadas, com estratégias específicas por parte ou grupo.

Planejar as comunicações

3

O QUE É

- O planejamento de comunicação está profundamente ligado à análise das partes interessadas.
- Determine como comunicar dentro e fora da equipe e que categorias de informação cada grupo precisa.
- A informação é interna ou externa? sensível ou pública? geral ou detalhada?



Benefício-chave

Garante que cada grupo receba a informação de que precisa.



Saída principal

O Plano de Gerenciamento das Comunicações o guia operacional do fluxo de informação.

Gerenciar o engajamento

4

O QUE É

- É o processo ativo e diário de trabalhar com as partes interessadas durante a execução.
- Significa colaborar com patrocinadores, enfrentar problemas de frente e fomentar o envolvimento.
- É onde o plano encontra a realidade e onde suas soft skills mais importam.



Benefício-chave

Mais apoio e resistência fortemente reduzida.



Foco

Aqui o relacionamento é construído no dia a dia: presença, escuta e resolução de conflitos.

Gerenciar as comunicações

5

O QUE É

- Assegura que a informação seja coletada, criada, distribuída e armazenada em tempo hábil.
- Cobre todos os aspectos do fluxo de informação, incluindo a escolha de tecnologias e métodos.
- Permite ajustes conforme as necessidades das partes e as condições do projeto mudam.



Benefício-chave

Informação disponível no momento certo, para quem precisa.



Foco

Canais, ferramentas e registros a comunicação como um sistema, não como e-mails avulsos.

Monitorar o engajamento

6

O QUE É

- Monitorar significa avaliar ativamente se os esforços de engajamento estão realmente funcionando.
- Identifica ajustes e refina estratégias à medida que o projeto evolui, para sustentar a eficácia.
- Uma tática que funcionou no planejamento pode falhar completamente durante a entrega.



Benefício-chave

Mantém a estratégia de engajamento sempre atual.



Foco

Compare o engajamento atual com o desejado e aja sobre a diferença não sobre suposições.

Monitorar as comunicações



O QUE É

- Este processo final assegura que as necessidades reais de informação do projeto e das partes sejam satisfeitas.
- Verifica se os planos de comunicação estão funcionando como o previsto.
- Sinaliza para você quando eles não estão para corrigir a rota.



Benefício-chave

Confirma que as necessidades de informação estão sendo atendidas.



Foco

Feche o ciclo: colete feedback sobre a própria comunicação e ajuste o plano.

Classificando: a matriz Poder × Interesse

PODER ▲

Manter satisfeito <i>Alto poder · baixo interesse</i> Mantenha por perto, sem sobrecarregar.	Gerenciar de perto <i>Alto poder · alto interesse</i> Parceiros-chave: máxima atenção.
Monitorar <i>Baixo poder · baixo interesse</i> Esforço mínimo, mas não os ignore.	Manter informado <i>Baixo poder · alto interesse</i> Comunique com frequência; podem ajudar.

INTERESSE ►

Outras lentes de classificação



Poder / Influência

Autoridade formal versus capacidade de influenciar ativamente o projeto.



Impacto / Influência

Quanto a parte é impactada versus quanto pode alterar o resultado.



Modelo de Saliência

Combina poder, urgência e legitimidade (próximo slide).




A classificação orienta o esforço mas o mapa muda de fase para fase. Reavalie sempre.

Modelo de saliência e direções de influência

Modelo de saliência

Classifica as partes por três atributos que se sobrepõem:

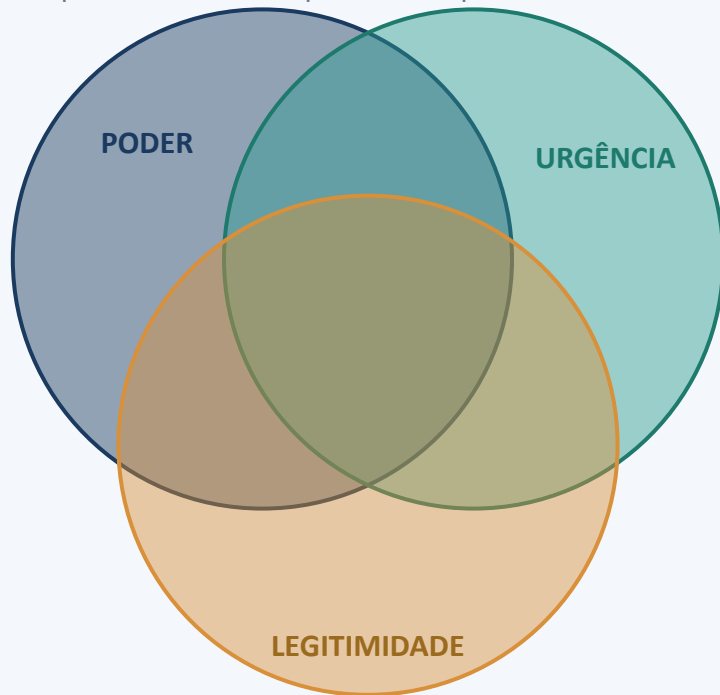

No centro: as partes mais "salientes" máxima prioridade de engajamento.

Direções de influência



Ascendente

Alta gerência, patrocinador, comitê diretivo.



Descendente

A equipe e quem trabalha no projeto.



Lateral

Pares do gerente: outros líderes e áreas.



Externa

Fornecedores, órgãos, clientes, comunidade.

Matriz de avaliação do engajamento

Compara o nível ATUAL (C) de cada parte com o nível DESEJADO (D). A lacuna entre eles orienta a estratégia de engajamento.

Parte interessada	Desinformado	Resistente	Neutro	Apoiador	Líder
Patrocinador			C		D
Usuários finais	C			D	
Fornecedor de API		C	D		
Órgão regulador			C/D		

C

 = nível atual

D

 = nível desejado

Maior lacuna aqui: os usuários finais (Desinformado → Apoiador) exigem atenção prioritária.

Os três artefatos que você vai produzir



Registro das Partes Interessadas

A lista viva de quem são as partes.

CONTÉM

- Identificação e papel
- Interesses e expectativas
- Poder, influência e impacto
- Classificação e prioridade



Plano de Engajamento

Como levar cada parte ao nível desejado.

CONTÉM

- Nível atual x desejado
- Estratégia por parte/grupo
- Ações e responsáveis
- Gatilhos de reavaliação



Plano de Comunicações

O guia operacional do fluxo de informação.

CONTÉM

- O quê e para quem
- Formato e canal
- Frequência e cadência
- Responsável e método

Exemplo integrado app de biblioteca acadêmica

Uma dupla desenvolve um app para reserva de livros. Veja o domínio aplicado de ponta a ponta:



Passo 1

Identificar

Usuários (alunos), orientador, TI da instituição e fornecedor de nuvem entram no Registro.



Passo 2

Classificar

Orientador = alto poder / alto interesse → gerenciar de perto. Alunos = manter informado.



Passo 3

Avaliar engajamento

Usuários estão "Desinformados"; a meta é torná-los "Apoiadores" com testes participativos.



Passo 4

Engajar e monitorar

Demonstração quinzenal ao orientador; formulário de feedback dos usuários a cada sprint.

Tailoring: ajustando o domínio à sua realidade

Você não pode copiar e colar estes processos. Cada projeto é único o método precisa seguir o contexto.




Cultura organizacional

Organizações planas usam canais abertos e informais. Hierárquicas usam estruturas formais e caminhos de escalonamento definidos. Sua estratégia deve casar com a cultura.



Tipo de produto

Em ambientes ágeis, o engajamento é embutido no ciclo do produto — sprint reviews e retrospectivas são pontos estruturados de engajamento, não só reuniões.



IA e LLMs

Avalie o uso de IA a cada projeto. Ela ajuda a produzir artefatos de comunicação mais rápido? Introduz riscos a serem avaliados com a equipe de cibersegurança?

Projeto global → atualizações multilíngues e fóruns virtuais. Fábrica local → reuniões mensais presenciais. O contexto decide.

Inteligência artificial e partes interessadas

COMO A IA APOIA

- Gerar artefatos de comunicação (resumos, atas, relatórios) com mais rapidez.
- Analisar sentimento e feedback para antecipar resistência.
- Priorizar partes com análise preditiva.
- Fortalecer recomendações com visualização de dados.



Cuidados essenciais

- A IA não substitui o julgamento humano valide sempre.
- Privacidade e proteção de dados das partes interessadas.
- Viés algorítmico pode distorcer a leitura das pessoas.
- Avalie riscos de cibersegurança do uso de ferramentas de IA.



Para as duplas:

documentem no relatório se e como usaram IA para apoiar o engajamento e quais cuidados adotaram.

Conexões com os outros domínios

As partes interessadas estão entrelaçadas em todo o projeto. Este domínio conecta-se diretamente aos demais:



Erros comuns e dicas de ouro



Armadilhas a evitar

- Tratar a identificação como tarefa única do kickoff.
- Presumir que o patrocinador está engajado.
- Padronizar a comunicação para todos igualmente.
- Esquecer a equipe e os fornecedores como partes.
- Trabalhar com um registro feito há três meses.



Dicas de ouro

- Reveja o registro a cada mudança ou marco do projeto.
- Cultive um patrocinador ativo e calibre a comunicação a ele.
- Personalize formato, canal e frequência por parte interessada.
- Meça o engajamento (atual × desejado) e aja sobre a lacuna.
- Documente tudo e use IA com critério e cuidado.

Mensagens-chave para levar



É uma paisagem, não uma lista

Engajamento é disciplina contínua e viva o mapa muda a cada fase.



O patrocinador ativo é crítico

Sponsor engajado é fator de sucesso; ausente, é um risco.



Cinco conceitos, sete processos

Satisfação, equipe, comunicação, dados e fornecedores, do identificar ao monitorar.



Meça e adapte

Classifique, avalie o engajamento (C→D) e faça o tailoring ao contexto.

REFERÊNCIAS

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) — 8ª ed. Newtown Square: PMI, 2025. · Domínio de Desempenho das Partes Interessadas. · Materiais complementares de estudo do PMBOK 8 (2026).

Aplicando as Partes Interessadas ao seu projeto

Seguimos com o projeto que cada grupo está executando.

Desenvolvam e documentem esta área e anexem ao projeto na próxima aula vamos revisitar o tema.



Identificar e registrar

Levantem todas as partes interessadas (internas e externas) e montem o Registro das Partes Interessadas.



Classificar e avaliar

Apliquem a matriz Poder × Interesse e a matriz de engajamento (nível atual → desejado).



Planejar

Elaborem, de forma resumida, o Plano de Engajamento e o Plano de Comunicações.



Documentar e anexar

Consolidem tudo em um documento e anexem ao projeto da dupla para entrega.



Entrega:

documento anexado ao projeto da dupla. Revisitaremos esta área na próxima aula, evoluindo o engajamento conforme o projeto avança.
